

## 地下水浄化に係る第3次評価結果に基づく追加対策工事の実施内容

### 1 追加対策工事の実施内容

昨年度実施した地下水浄化に係る第3次評価の結果、第二帯水層高濃度エリアにおいて、局所的に浄化が進んでいない場所が判明したことから、当該場所の浄化を促進するため、新たに注水井戸3基及び注水用横ボーリング2本を設置することを第65回協議会で決定した（添付資料1）。

設置工事は本年6月に着手し、注水用横ボーリングは8月に、注水井戸は9月にそれぞれ完了した（添付資料2）。

#### 【工事内容等】

工事内容	仕様			
	口径	深さ	対象帯水層	設置箇所
注水井戸				
IW-31	φ 250mm	13.5m	第二帯水層	DW-7 付近
IW-32	φ 250mm	13.5m	第二帯水層	DW-11 付近
IW-33	φ 250mm	12.5m	第二帯水層	DW-18 付近
注水用横ボーリング	口径	長さ	対象帯水層	設置箇所
No. 1	φ 75mm	30m	第二帯水層	CW-2 からア-43 方向
No. 2	φ 75mm	35m	第二帯水層	CW-2 から DW-16 方向


### 2 新設した設備の稼働状況

設置工事が完了した設備から順次注水を開始し、以降継続して注水を行っている。

○注水用横ボーリング：8月12日工事完了、8月19日から注水開始


○注水井戸：9月10日工事完了、9月15日から注水開始

内容（平面図）

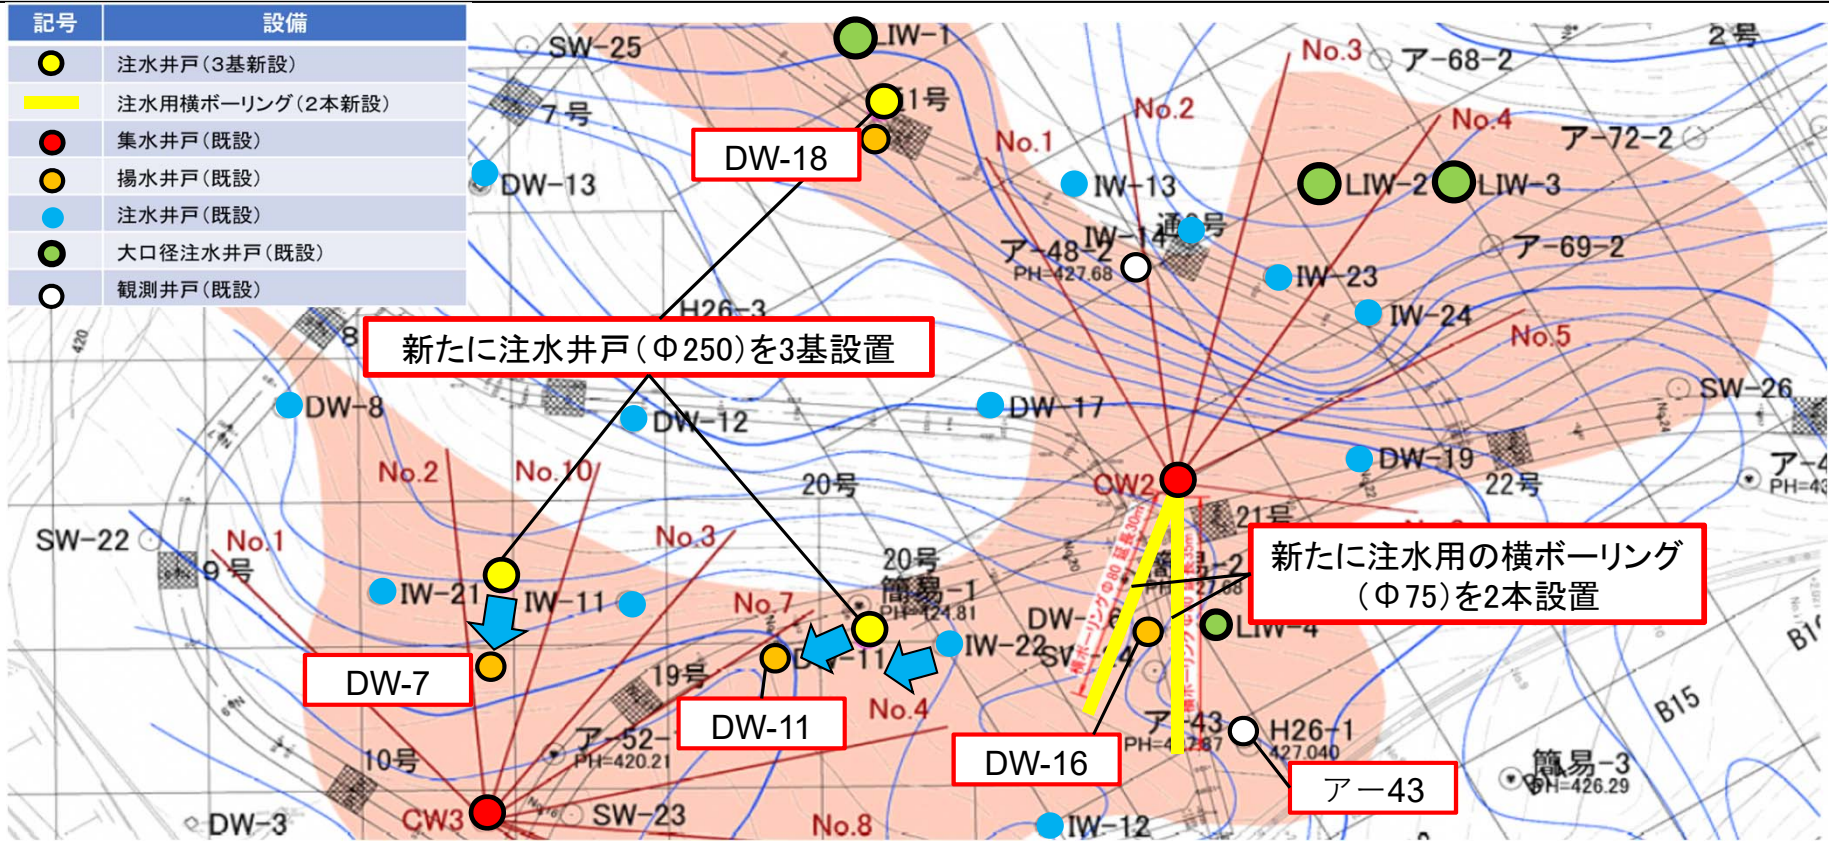


イメージ(断面図)

注水井戸の新設

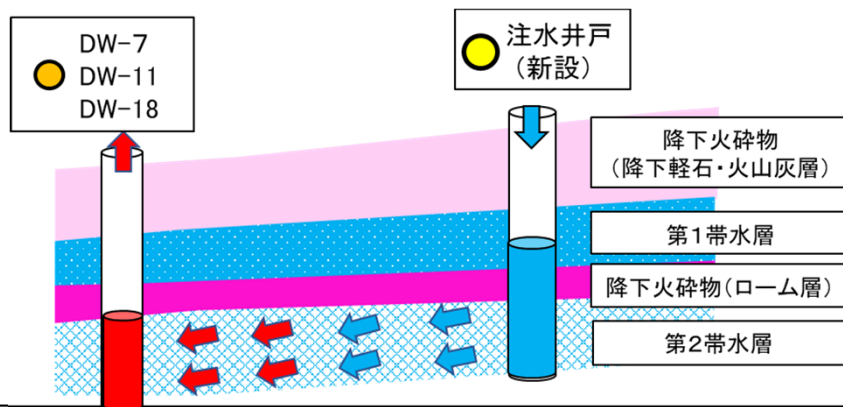

注水用横ボーリングの新設

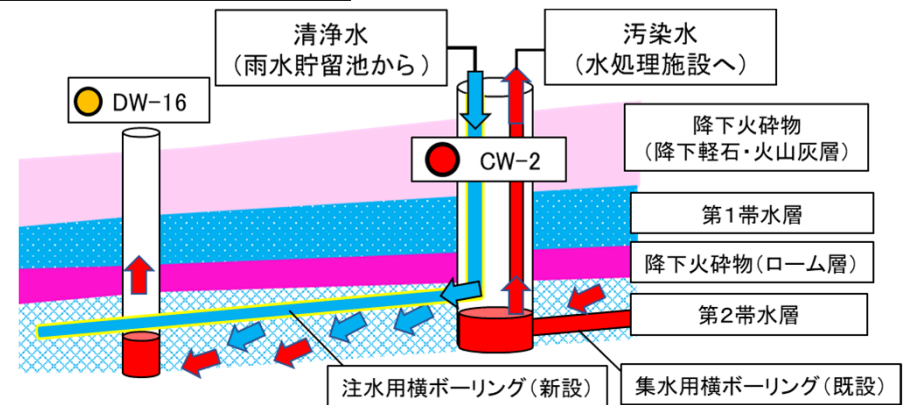


# 追加対策工事の施工状況

I W - 3 1  
R 3.9.15より注水開始



I W - 3 2  
R 3.9.15より注水開始

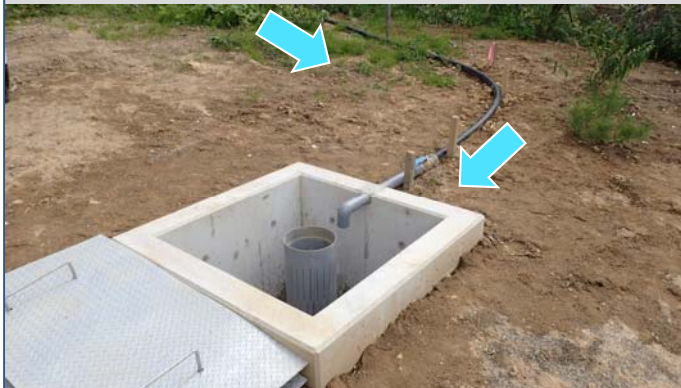

I W - 3 3  
R 3.9.15より注水開始



注水用横ボーリング R 3.8.19より注水開始

