

緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく 通学路の安全を確保するあおもりの道づくり(防災・安全)

事業主体 青森県
計画期間 H25～H29


■計画の概要

計画の目標


緊急合同点検により要対策箇所と位置づけられた通学路の整備を促進し、安全・安心な通学路を確保する。
通学路交通安全プログラムに位置づけられる対策必要箇所の整備を推進し、安全・安心な通学路を確保する。

成果目標

①緊急合同点検結果による通学路の要対策箇所の整備率を61.5%(H29末)に進捗させる。



②緊急合同点検および交通安全プログラムに位置づけられる対策必要箇所のうち、本整備計画に記載される箇所の整備率を63.2%(H29末)に進捗させる。



事業内容

・通学路における歩道整備等の交通安全事業を実施

- | | |
|------|--|
| 代表工区 | <ul style="list-style-type: none"> ➢上野十和田線 上野工区(歩道整備) L=1.3km ➢国道394号 乙供工区(自歩道整備) L=0.8km ➢鱒ヶ沢蟹田線 中師工区(歩道整備) L=0.6km etc. |
|------|--|

■事後評価の結果

事業実績

➢整備率による進捗


- ①緊急合同点検結果による要対策箇所【13事業】対策済7事業、整備率53.8%
- ②緊急合同点検・交通安全プログラムによる要対策箇所【64事業】対策済25事業、整備率39.1%

➢完成した代表事例




成果目標(H29末)の達成状況

①緊急合同点検結果による通学路の要対策箇所の整備率%(=対策済み箇所数/要対策箇所数)



②緊急合同点検および交通安全プログラムに位置付けられる対策必要箇所の整備率%(=対策済み箇所数/要対策箇所数)



■今後の方針

成果目標は未達成となったが、当計画において未完了事業においては、次期計画にて引き続き実施する。

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年2月25日

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあもりの道づくり (防災・安全)				重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度	(5年間)	交付対象	青森県
計画の目標						

緊急合同点検により要対策箇所と位置付けられた通学路の整備を促進し、安全・安心な通学路を確保する。
通学路交通安全プログラムに位置づけられる対策必要箇所の整備を推進し、安全・安心な通学路を確保する。

計画の成果目標 (定量的指標)	緊急合同点検結果による通学路の要対策箇所の整備率を61.5% (H29末) に進捗させる。 緊急合同点検および交通安全プログラムに位置付けられる対策必要箇所のうち、本整備計画に記載される箇所の整備率を63.2% (H29末) に進捗させる。					
-----------------	---	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H25当初)	(H27末)	(H29末)	
1. 緊急合同点検に基づく通学路要対策箇所の整備率 (整備率) = (H29末時点における対策済み箇所数) / (緊急合同点検に基づく要対策箇所数) × 100%	0.0%	53.8%	61.5%	H25当初で母数が13箇所、H27末までに7箇所、H29末までに8箇所の対策を完了させる。
2. 本整備計画に記載される対策必要箇所の整備率 (整備率) = (H29末時点における対策済み箇所数) / (本整備計画に記載される対策必要箇所数) × 100%		33.3%	63.2%	H27末時点で母数が57箇所、19箇所対策済み、H29末までに36箇所の対策を完了させる。

全体事業費	合計 (A + B + C + D)	9,891 百万円	A	9,876 百万円	B	15 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.0%
-------	--------------------	--------------	---	--------------	---	-----------	---	----------	---	----------	-----------------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
・県道路課が実施	・平成30年度
	公表の方法
	・県ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H25	H26	H27	H28	H29				
20-A271	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 稲盛千代町山田線 木造浦船	現道拡幅 L=1.2km	つがる市					232		—	向陽小	
20-A273	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 八戸大野線 金山沢	歩道整備 L=0.8km	階上町					75		—	是川東小	
20-A274	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 橋向五戸線 上市川	歩道整備 L=1.3km	五戸町					65		—	上市川小	
20-A275	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 櫛引上名久井三戸線 在府小路町	歩道整備 L=0.4km	三戸町					130		—	三戸小	
20-A276	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 上野十和田線 上野	歩道整備 L=1.3km	東北町					175		—	H33完 上北小	
20-A277	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道394号 乙供	自歩道整備 L=0.8km	東北町					80		—	蛭沢小	
20-A278	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 弘前鱒ヶ沢線 高杉II	歩道整備 L=1.0km	弘前市					183		—	H30完 高杉小	
20-A279	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 畑中竹鼻線 八反田	歩道整備 L=0.3km	田舎館村					10		—	田舎館小	
20-A280	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 石川百田線 百田	歩道整備 L=0.3km	弘前市					131		—	H30完 城東小	
20-A281	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道101号 浅井	歩道整備 L=0.9km	五所川原市					190		—	H30完 三輪小	
20-A282	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道280号 沖館～新田	歩道整備 L=1.5km	青森市					55		—	沖館小	
20-A283	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 鶴ヶ坂千刈線 白旗野	自歩道整備 L=1.2km	青森市					528		—	H29完 新城中央小	
20-A284	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 清水川滝沢野内線 野内	歩道整備 L=1.1km	青森市					131		—	H30完 野内小	
20-A285	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 今別蟹田線 二股	交差点改良 L=0.2km	今別町					168		—	今別小	
20-A286	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 弘前鱒ヶ沢線 大森	歩道整備 L=1.8km	弘前市					310		—	H30完 草薙小	
20-A287	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 平賀門外線 館田	歩道整備 L=1.9km	平川市					265		—	H30完 松崎小	
20-A288	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 稲盛千代町山田線 木造赤根	歩道整備 L=0.3km	つがる市					75		—	向陽小	
20-A289	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 三沢十和田線 大町	歩道整備 L=0.1km	三沢市					190		—	上久保小	
20-A290	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道339号 毘沙門	歩道整備 L=0.7km	五所川原市					288		—	H30完 いずみ小	
20-A291	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 弘前鱒ヶ沢線 鬼沢	歩道整備 L=1.0km	弘前市					172		—	H30完 自得小	
20-A292	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道340号 平中	交差点改良 L=0.2km	八戸市					90		—	長者小	
20-A293	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 五所川原黒石線 大俵	歩道整備 L=0.5km	板柳町					180		—	H31完 小阿弥小	
20-A294	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一) 櫛引上名久井三戸線 梅内	歩道整備 L=0.8km	三戸町					226		—	H30完 三戸小	
20-A295	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道338号 金谷	交差点改良 L=0.2km	むつ市					34		—	第二田名部小	
20-A296	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国) 国道454号 金ヶ沢	歩道整備 L=0.7km	新郷村					382		—	H30完 戸来小	
20-A297	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 田子十和田湖線 野々上～池振	歩道整備 L=1.1km	田子町					245		—	H31完 田子小	
20-A298	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主) 五所川原岩木線 宮館	歩道整備 L=0.9km	弘前市					286		—	H30完 船沢小	

20-A299	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	石川土手町線	住吉町	交差点改良	L=0.1km	弘前市							369	—	H30完	大成小
20-A300	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	久渡寺新寺町線	樹木	歩道整備	L=0.2km	弘前市							113	—	H28完	桔梗野小
20-A302	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	野辺地野辺地(停)線	前田	歩道整備	L=0.8km	野辺地町							53	—		野辺地小
20-A303	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	五所川原浪岡線	郷山前	歩道整備	L=0.9km	青森市							450	—		浪岡野沢小
20-A304	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	鱒ヶ沢蟹田線	中師	歩道整備	L=0.6km	外ヶ浜町							194	—		蟹田小
20-A305	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	苔米地免内線	苔米地(1)	歩道整備	L=0.3km	南部町							326	—	H30完	福地小
20-A306	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	差波新井田線	新井田(1)	歩道整備	L=0.8km	八戸市							364	—		新井田小
20-A307	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	差波新井田線	新井田(2)	歩道整備	L=0.3km	八戸市							182	—		新井田小
20-A308	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	柵棚手倉橋線	間明田	視距改良	L=0.5km	新郷村							124	—		西越小
20-A310	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	大鱒浪岡線	浪岡	交差点改良	L=0.4km	青森市							266	—	H30完	浪岡南小
20-A311	道路	一般	青森県	直接		国道	交安	(国)	国道394号	西上川原	歩道整備	L=0.4km	七戸町							180	—	H31完	城南小
20-A316	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	津軽新城停車場油川線	新城	歩道整備	L=1.0km	青森市							476	—	H32完	新城中央小
20-A318	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	持子沢鶴田線	横蒔	視距改良	L=0.1km	鶴田町							20	—		梅沢小
20-A320	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	石無坂鹿田線	鹿田	現道拡幅	L=0.2km	新郷村							129	—	H30完	戸来小
20-A321	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	吹上金屋黒石線	町居	歩道整備	L=0.8km	平川市							496	—	H30完	平賀東小
20-A322	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	八戸階上線	鮫町	歩道整備	L=0.2km	八戸市							20	—		種差小
20-A323	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	八戸野辺地線	上笹橋	歩道整備	L=0.5km	東北町							115	—	H32完	蛭沢小
20-A326	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	石川百田線	百田Ⅱ	歩道整備	L=0.9km	弘前市							10	—	H34完	城東小
20-A342	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	中ノ渡十和田線	沢田	歩道整備	L=0.9km	十和田市							90	—	H32完	沢田小
20-A344	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	久栗坂造道線	東造道二丁目	交差点改良	L=0.6km	青森市							215	—	H32完	造道小
20-A345	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	久栗坂造道線	野内	歩道整備	L=0.1km	青森市							45	—		野内小
20-A346	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	十腰内陸奥森田停車場線	森田	歩道整備	L=0.4km	つがる市							53	—	H30完	森田小
20-A347	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	下北停車場線	中央二丁目	交差点改良	L=0.5km	むつ市							45	—		大平小
20-A348	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	弘前環状線	撫牛子	歩道整備	L=0.4km	弘前市							180	—	H31完	城東小
20-A349	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	三沢十和田線	高清水	交差点改良	L=0.6km	十和田市							70	—	H30完	高清水小
20-A350	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	青森五所川原線	羽白	歩道整備	L=0.2km	青森市							85	—	H32完	油川小
20-A351	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	前坂藤崎線	葛野	歩道整備	L=0.4km	藤崎町							40	—	H31完	藤崎中央小
20-A352	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	三沢十和田線	一本木沢	自歩道整備	L=1.6km	十和田市							130	—	H32完	東小
20-A353	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	石川百田線	撫牛子	歩道整備	L=0.4km	弘前市							85	—	H32完	城東小
20-A354	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	吹上金屋黒石線	長崎	歩道整備	L=0.4km	黒石市							55	—	H32完	黒石東小
20-A355	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	弘前鱒ヶ沢線	十面沢	視距改良	L=0.3km	弘前市							10	—	H33完	裾野小
20-A356	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	野辺地野辺地停車場線	前田Ⅱ	歩道整備	L=0.3km	野辺地町							20	—	H33完	野辺地小
20-A357	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	三沢十和田線	東町二丁目	交差点改良	L=0.2km	三沢市							60	—	H31完	木崎野小
20-A358	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	常海橋銀線	樽沢	視距改良	L=0.4km	青森市							15	—	H33完	浪岡野沢小
20-A359	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(一)	持子沢鶴田線	横蒔(歩道)	歩道整備	L=0.4km	鶴田町							10	—	H32完	梅沢小
20-A360	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	交安	(主)	八戸階上線	鮫町(中道踏切)	歩道整備	L=0.4km	八戸市							30	—	H31完	種差小
合計																			9,876				

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
20-B1	交安施設	一般	青森県	直接		整備	交通安全施設整備	支柱移設・灯器設置	外ヶ浜町 外						15		
合計													15				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
20-B1	新設・移設される信号柱・灯器等により道路利用者の視認性を高め、道路管理者と交通管理者が相互に連携し、早期の安全・安心な道路空間の確保を図る事が期待出来る。																

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
															0		
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
													0		
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	-	1,312	979	1,110	861
計画別流用 増△減額 (b)	-	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	-	1,312	979	1,110	861
前年度からの繰越額 (d)	-	273	600	363	563
支払済額 (e)	-	985	1,216	909	1,089
翌年度繰越額 (f)	-	600	363	563	335
うち未契約繰越額 (g)	-	397	134	220	171
不用額 (h = c+d-e-f)	-	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	-	25.1%	8.5%	15.0%	12.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	用地買収の交渉に伴い発生した相続問題により、不測の日数を要したため。	-	関係機関との協議に日数を要し工事着手に遅れが生じたため、また用地取得に不測の日数を要したため	用地交渉に不測の日数を要したため

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・通学路における歩道整備等の交通安全事業を実践したことにより、安全・安心な通学路が確保された。

II 定量的指標の達成状況	指標①（緊急合同点検に基づく通学路要対策箇所整備率）	最終目標値	61.5%	目標値と実績値に差が出た要因	・用地取得に不測の日数を要し、事業完了が当初予定より延びたため。
		最終実績値	53.8%		
	指標②（本整備計画に記載される対策必要箇所の整備率）	最終目標値	63.2%	目標値と実績値に差が出た要因	・用地取得及び関係機関との協議に不測の日数を要し、事業完了が当初予定より延びたため。
		最終実績値	39.1%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)


3. 特記事項（今後の方針等）

- ・当計画において未完了事業においては、次期計画にて引き続き実施する。

(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおりの道づくり (防災・安全)			
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度	交付対象 青森県

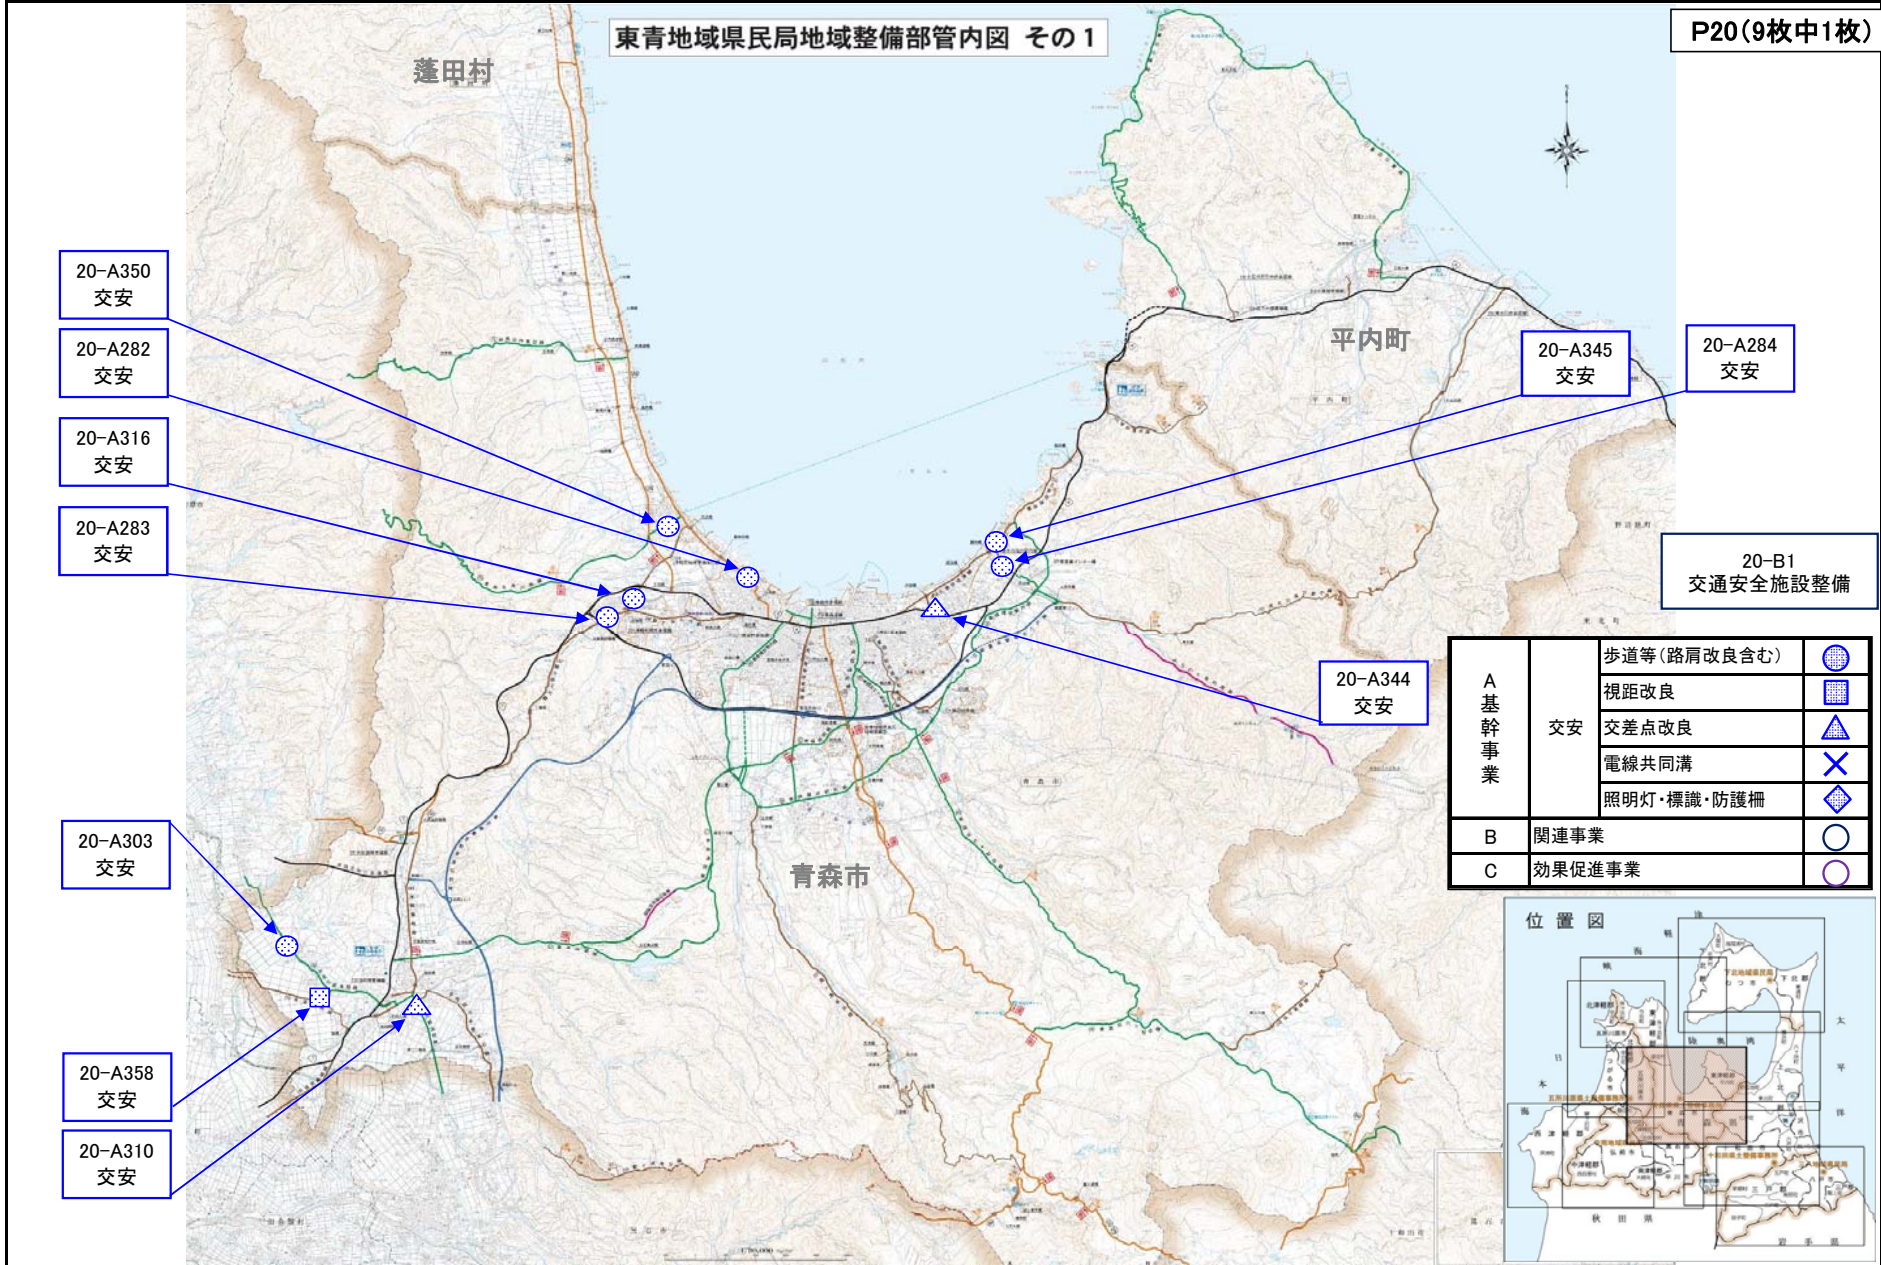

(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画

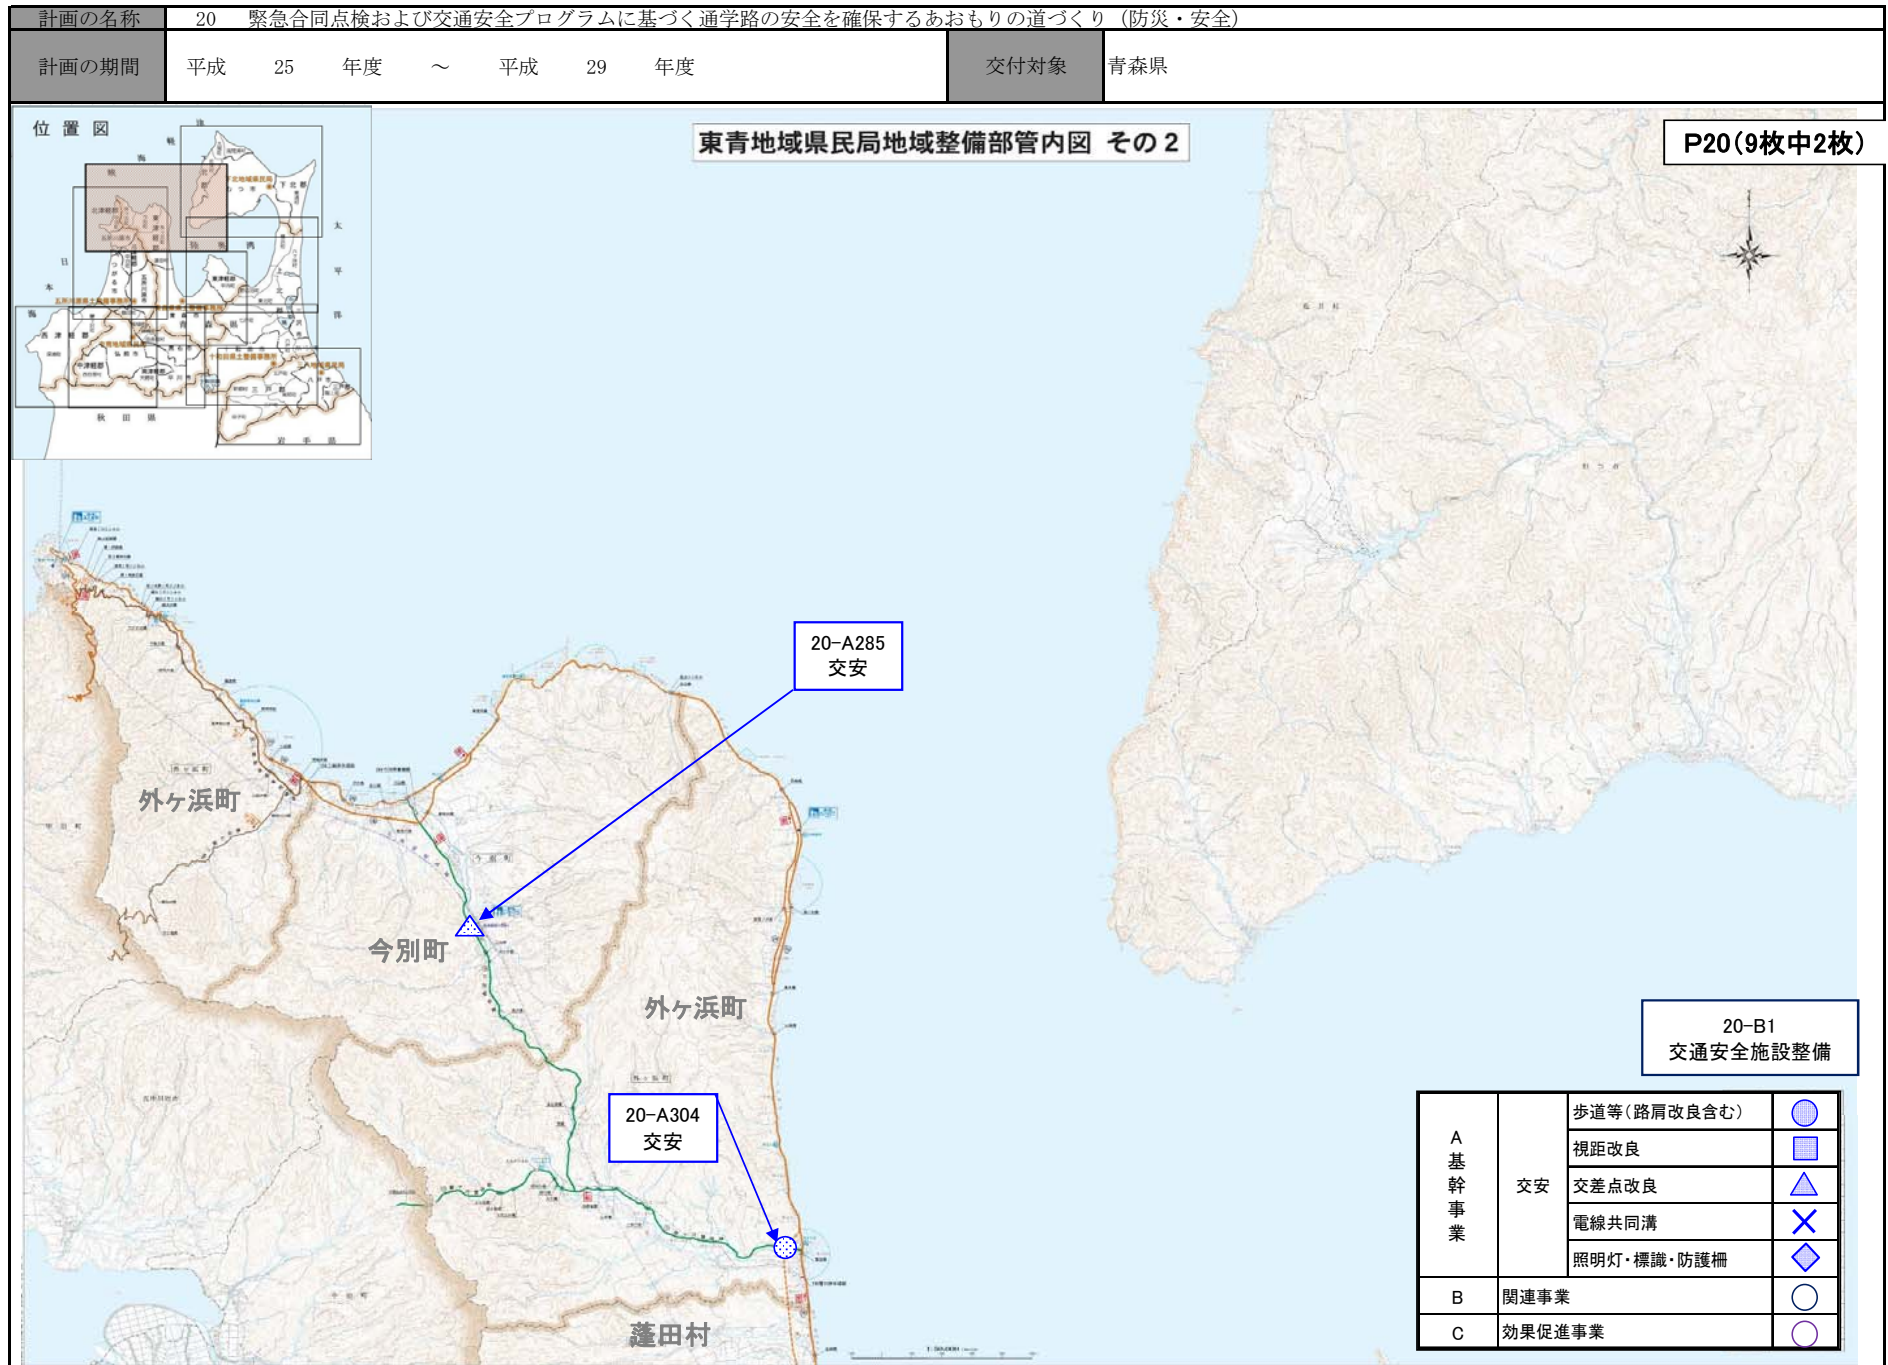

(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり (防災・安全)				交付対象	青森県
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度			

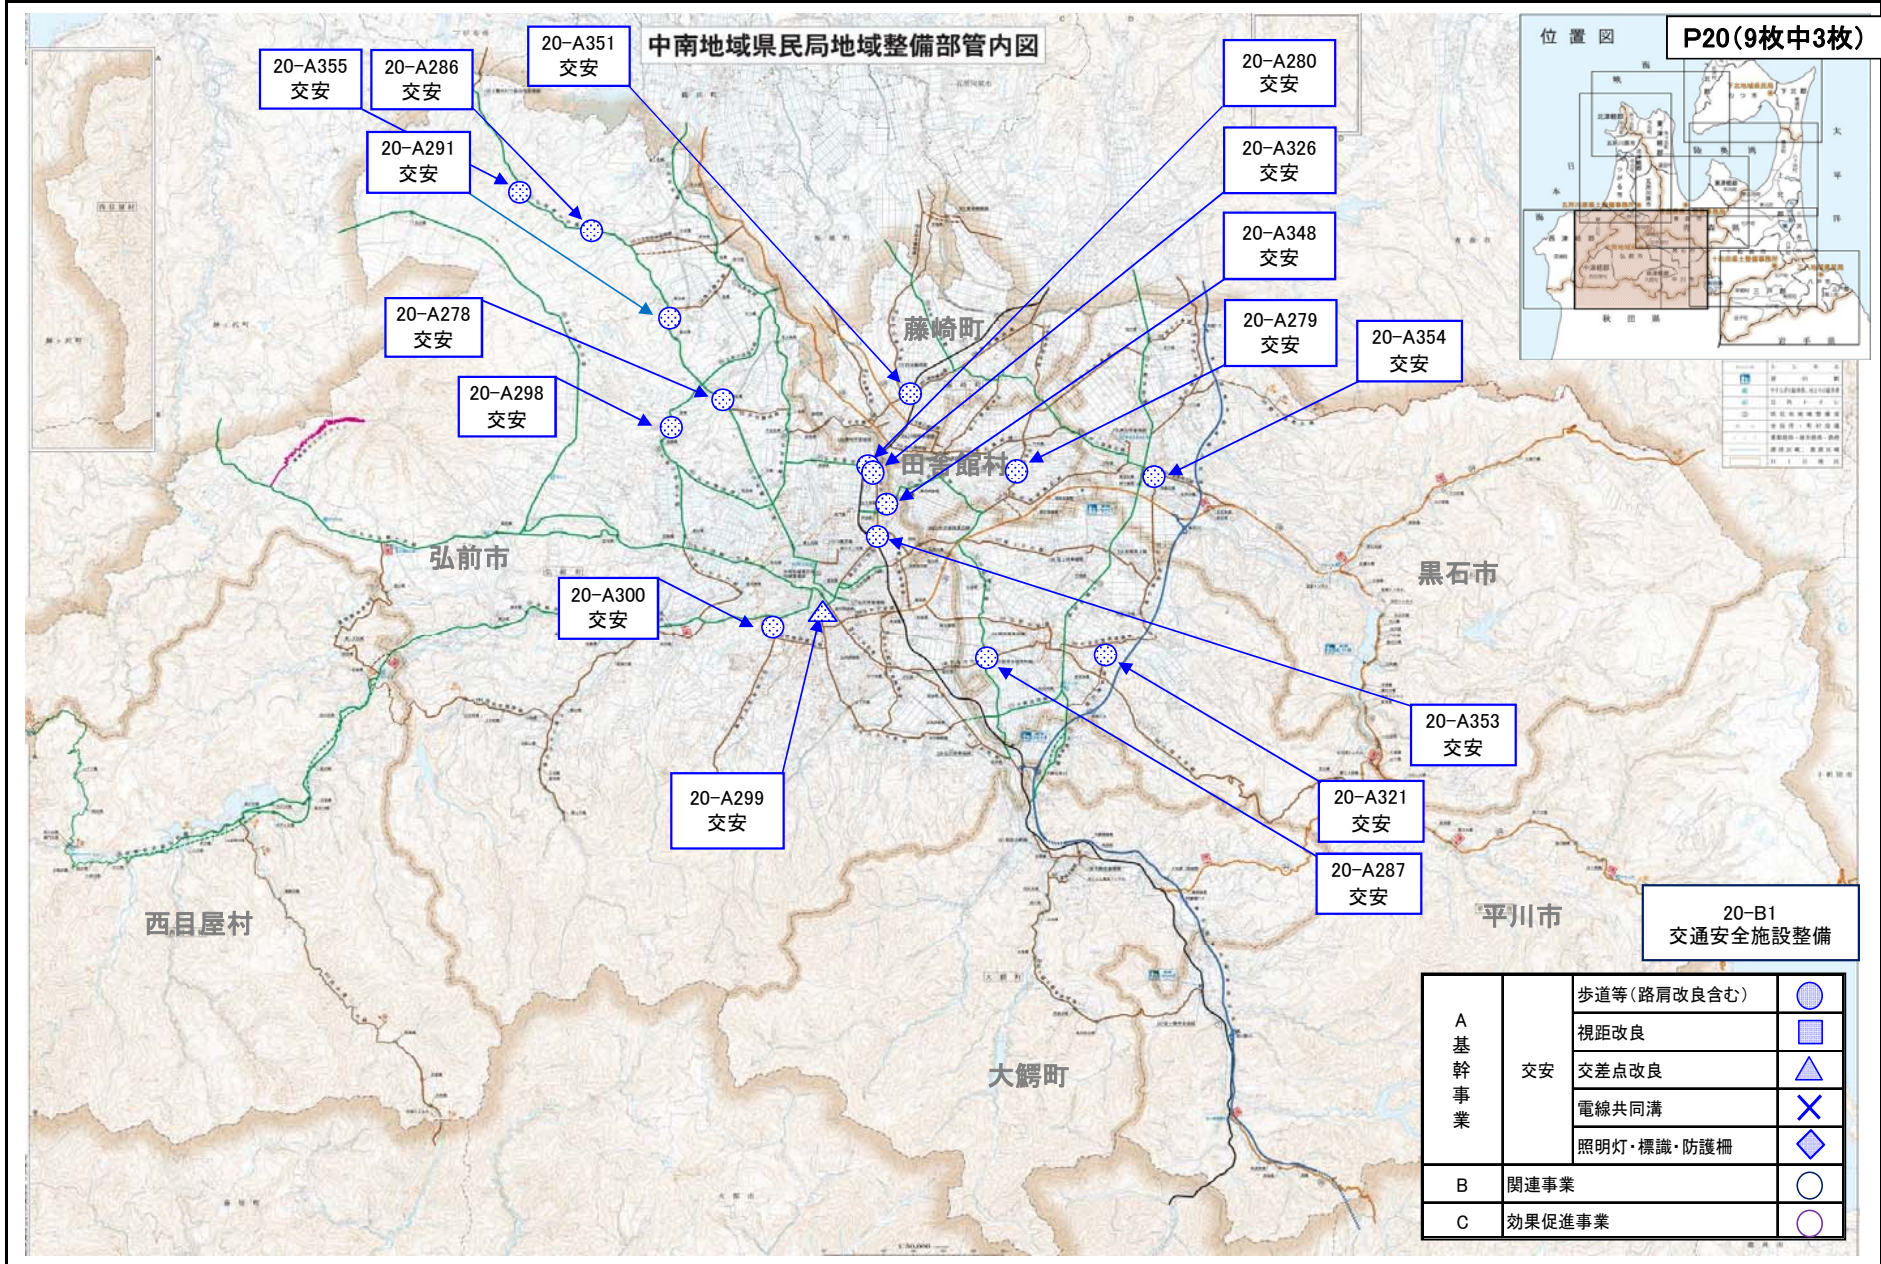


(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

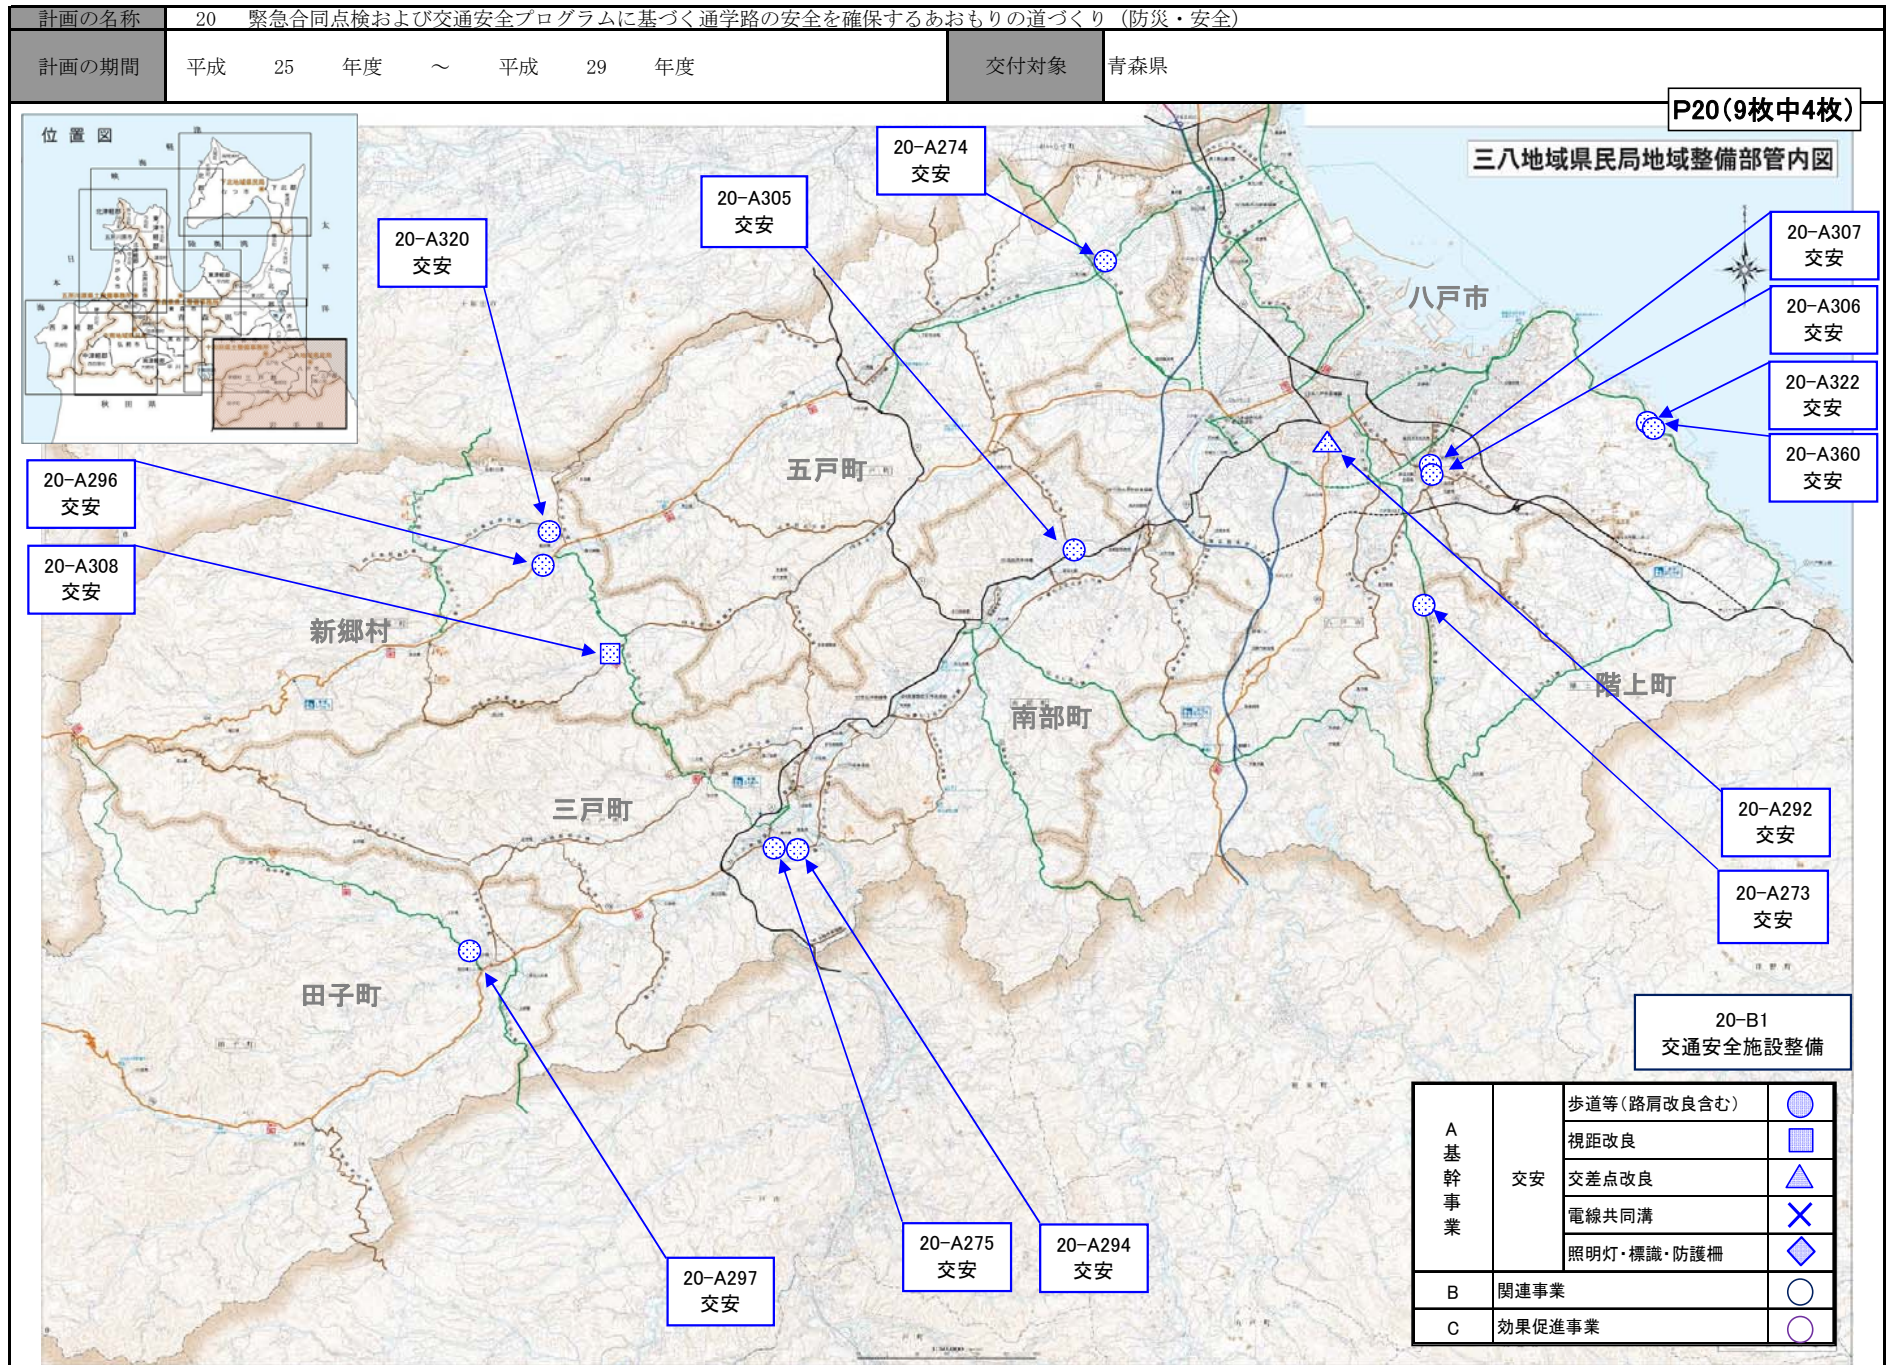

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

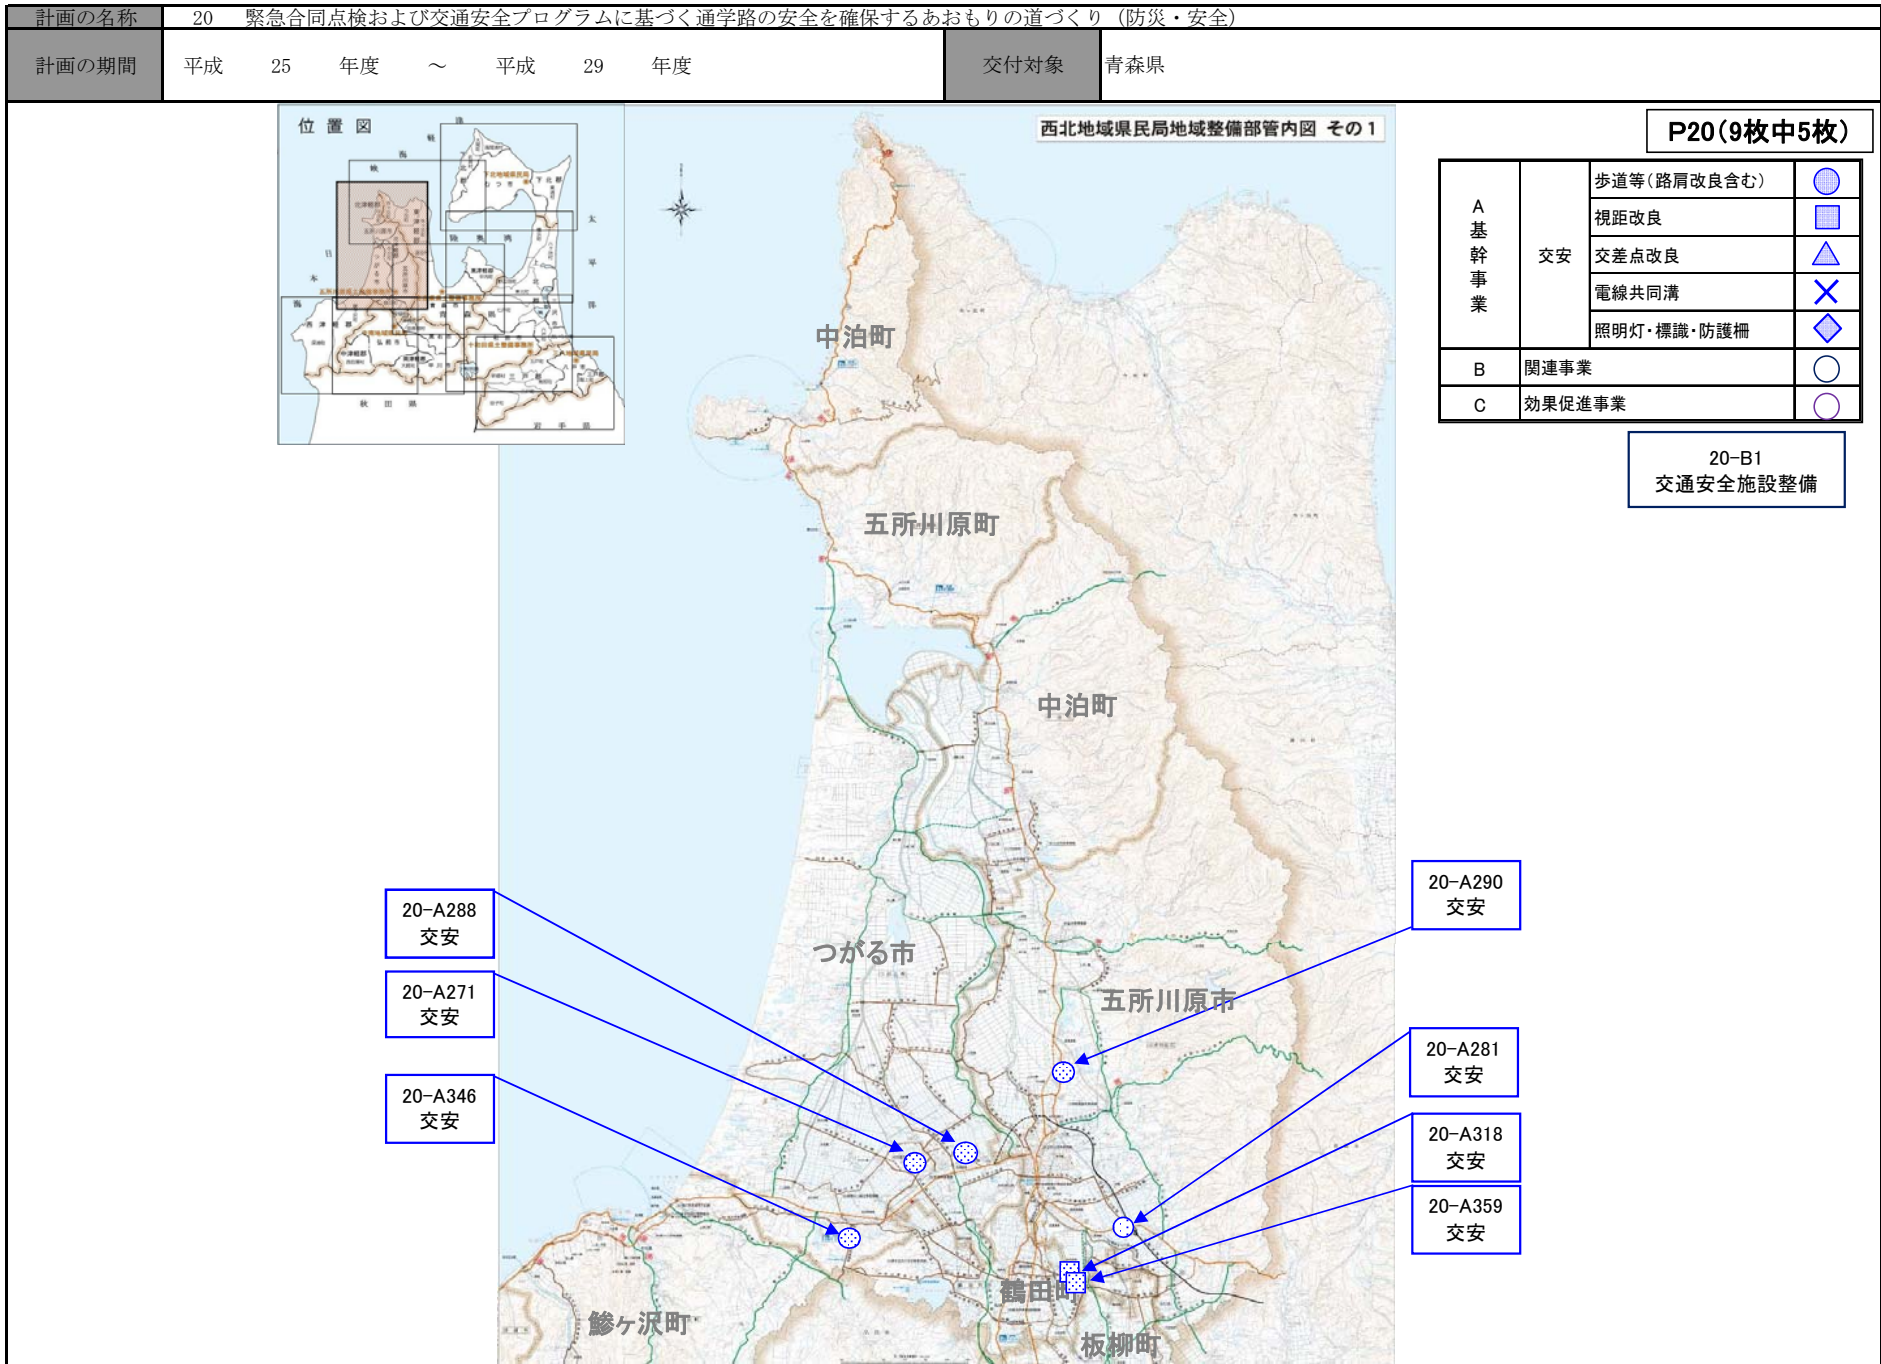


(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり (防災・安全)			
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度	交付対象 青森県

P20(9枚中6枚)

西北地域県民局地域整備部管内図 その2

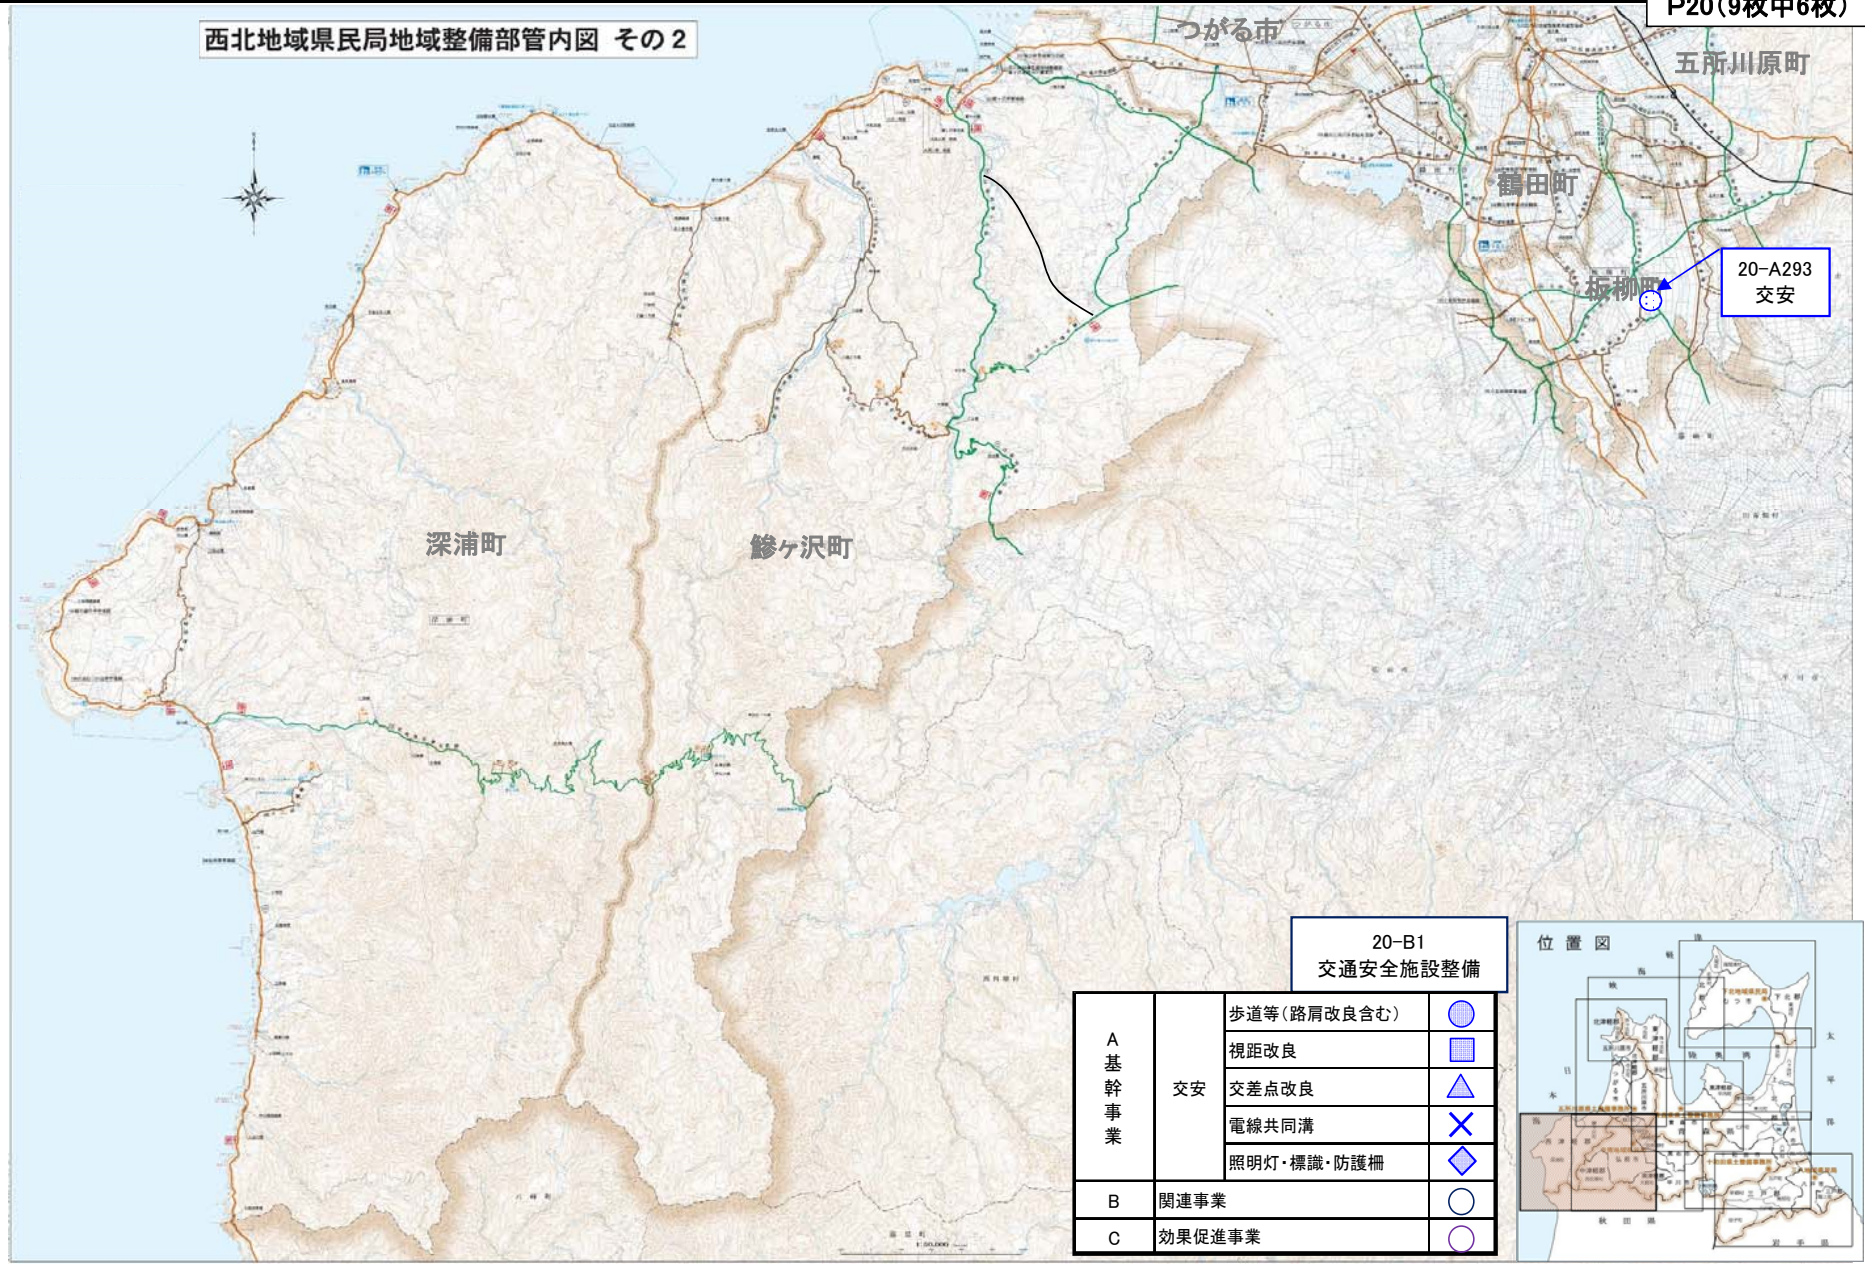

20-B1
交通安全施設整備


A 基幹事業	交安	歩道等(路肩改良含む)	●
		視距改良	■
		交差点改良	▲
		電線共同溝	×
		照明灯・標識・防護柵	◆
B	関連事業	○	
C	効果促進事業	◎	



(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり (防災・安全)				
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度	交付対象	青森県

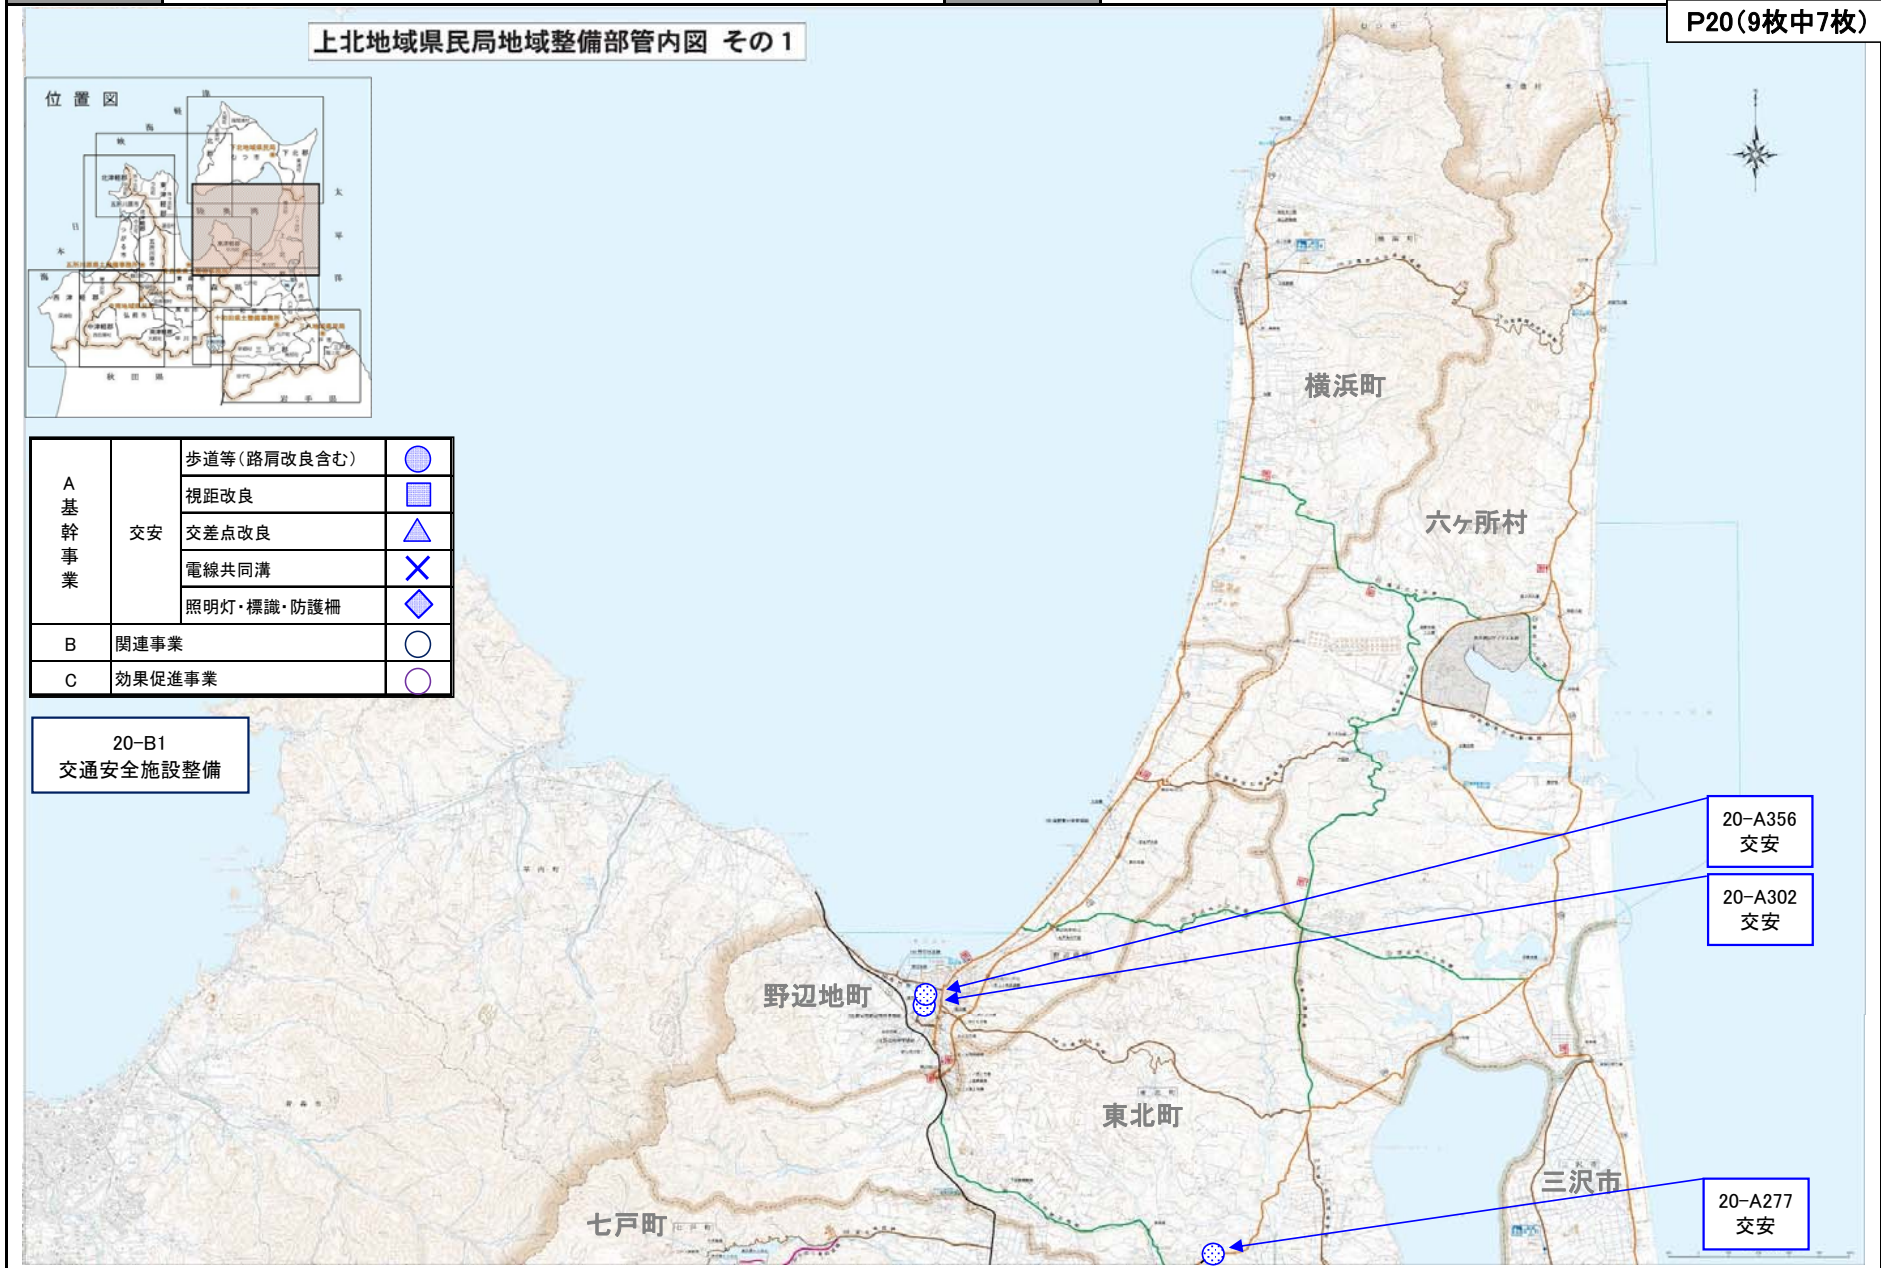

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

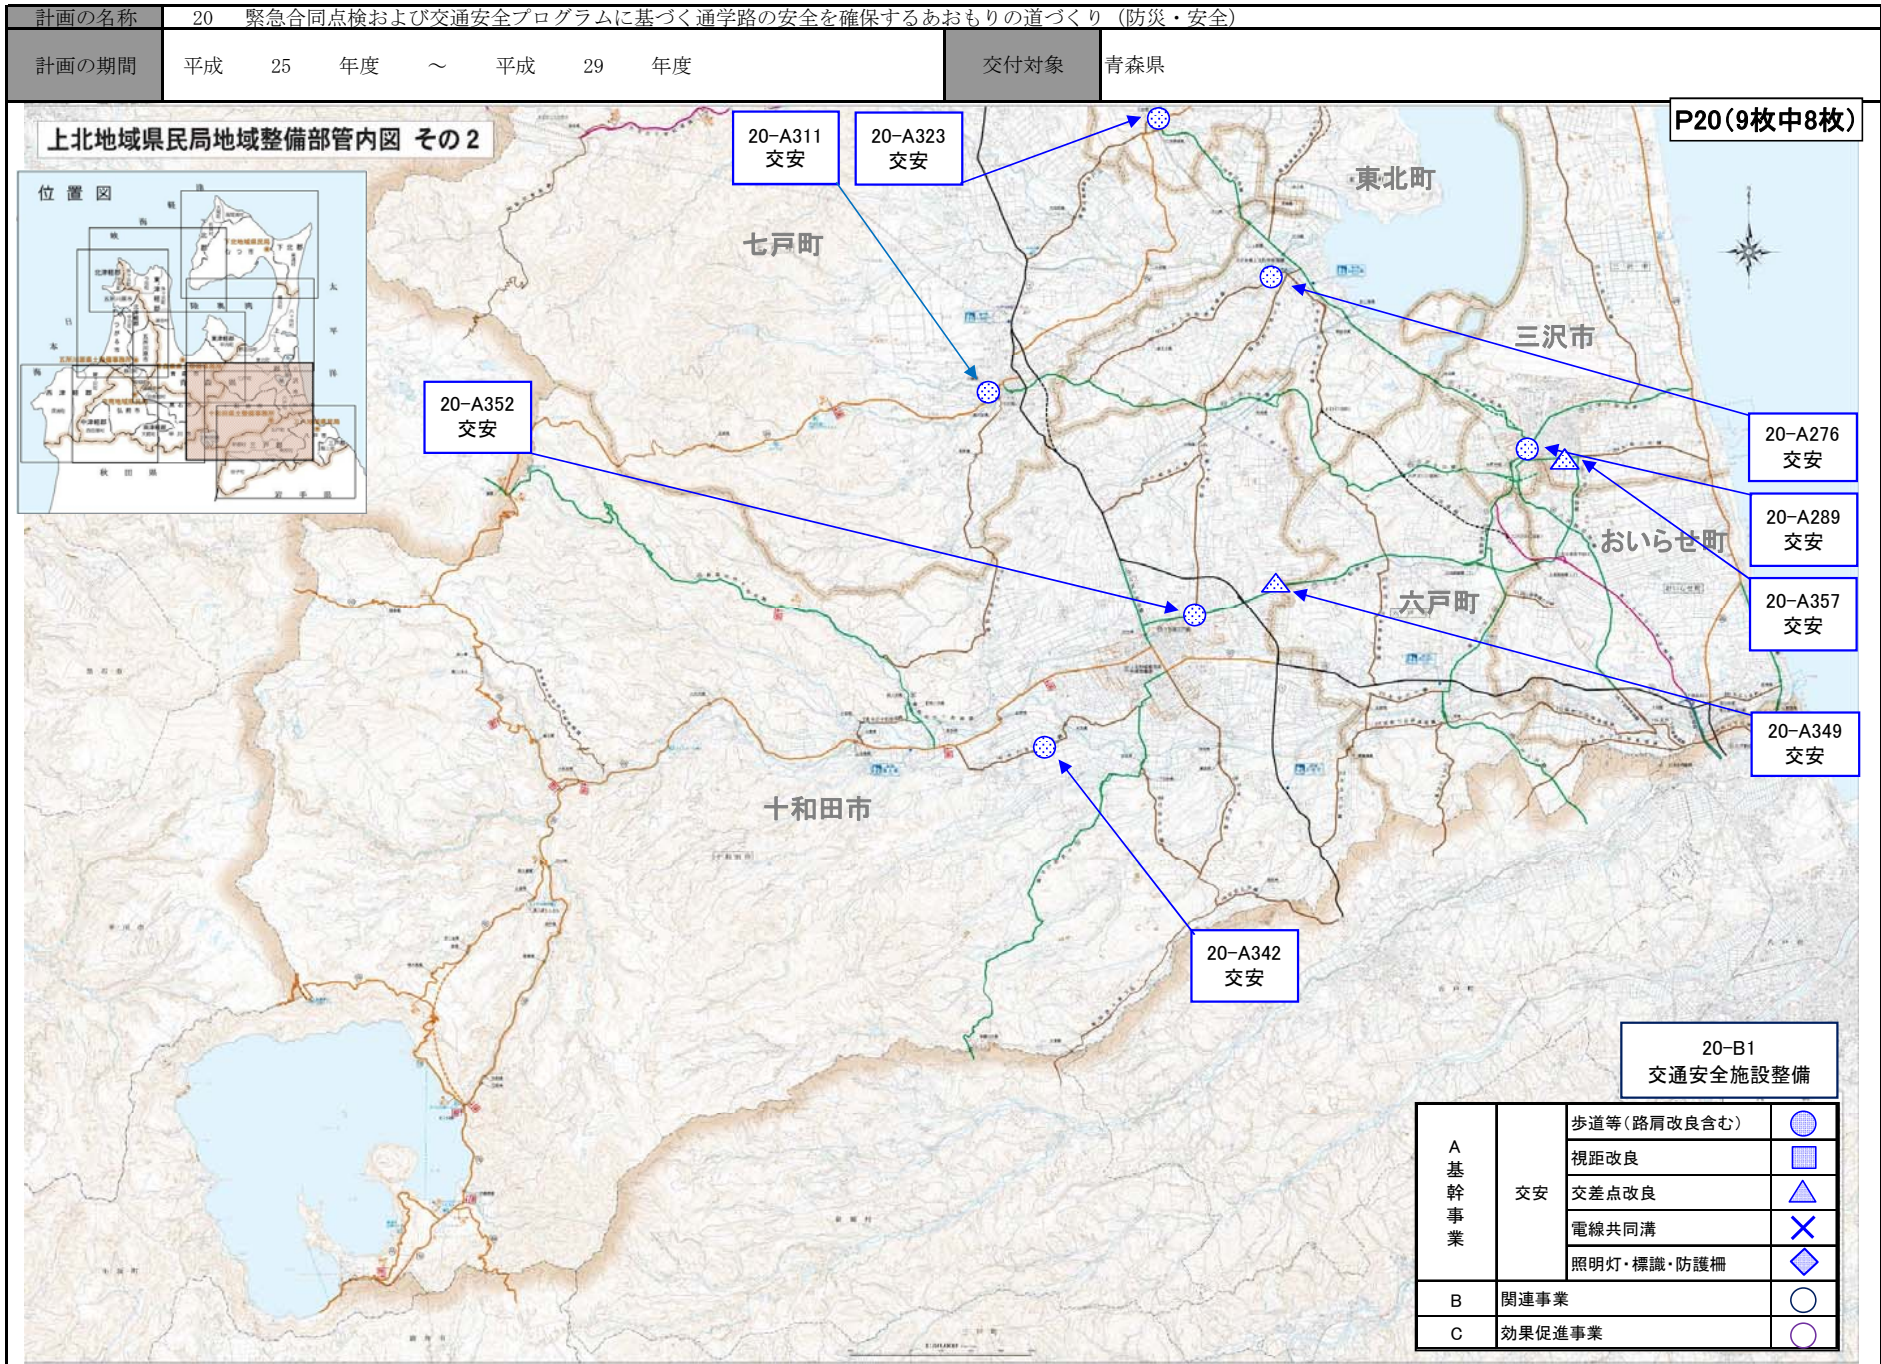

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	20 緊急合同点検および交通安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり (防災・安全)				
計画の期間	平成 25 年度	～	平成 29 年度	交付対象	青森県

