

## (費用対効果分析説明資料)

事業名	道路改築事業(県道改築事業)	地区名等	八戸環状線(糠塚)
-----	----------------	------	-----------

## 【費用対効果の算定内容】

## 1. 費用対効果の算定根拠

算定の考え方は「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(平成20年6月国土交通省)」による。また、具体的な算定手法については、「費用便益分析マニュアル(平成20年11月 国土交通省道路局 都市・地域整備局)」及び「道路事業における県独自の費用便益分析実施要綱(平成22年3月 青森県)」によった。

本マニュアルにおいては、社会的余剰を便益(B)とし、整備に係る総費用及び維持修繕費を現在価値に割り引いたものを費用(C)として評価するものである。

再評価においては、技術指針の考え方により、「事業全体の投資効率性」と、再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を除いた「残事業の投資効率性」の両者による評価をするものとした。

## 2. 事業全体の投資効率性

(1)道路整備に要する費用(便益を算出する事業延長L = 1.95 km)

C: 総費用 = 11,444 百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後50年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分	事業費	用地費	維持修繕費	総費用
単純合計	9,098	2,737	380	6,741
現在価値	11,649	356	151	11,444

(2)道路整備による便益

B: 総便益 = 28,288 百万円 B': 修正総便益 = 41,329 百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後50年間、各項目について整備があった場合の費用から整備がなかった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分	時間短縮	走行費用減少	交通事故減少	冬期	防災	総便益	地域修正係数	修正総便益
初年便益	1,483	78	0	1		1,562		
現在価値	26,203	1,561	494	30		28,288	1.461	41,329

## 3. 残事業の投資効率性

(1)道路整備に要する費用(便益を算出する事業延長L = 1.95 km)

C1: 総費用 = 1,165 百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後50年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分	事業費	用地費	維持修繕費	総費用
単純合計	1,039	0	380	1,419
現在価値	1,014	0	151	1,165

(2)道路整備による便益

B1: 総便益 = 28,288 百万円 B1': 修正総便益 41,329 百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後50年間、各項目について整備があった場合の費用から整備がなかった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分	時間短縮	走行費用減少	交通事故減少	冬期	防災	総便益	地域修正係数	修正総便益
初年便益	1,483	78	0	1		1,562		
現在価値	26,203	1,561	494	30		28,288	1.461	41,329

## 【費用対効果分析の結果】

(事業全体)

費用便益比 B / C (再評価時点・事業全体) = 28,288百万円 / 11,444百万円 = 2.47

修正費用便益比 B' / C (再評価時点・事業全体) = 41,329百万円 / 11,444百万円 = 3.61


(残事業)

費用便益比 B1 / C1 (再評価時点・残事業) = 28,288百万円 / 1,165百万円 = 24.28



修正費用便益比 B1' / C1 (再評価時点・残事業) = 41,329百万円 / 1,165百万円 = 35.48

[全体計画]

(1) 事業実施箇所位置図

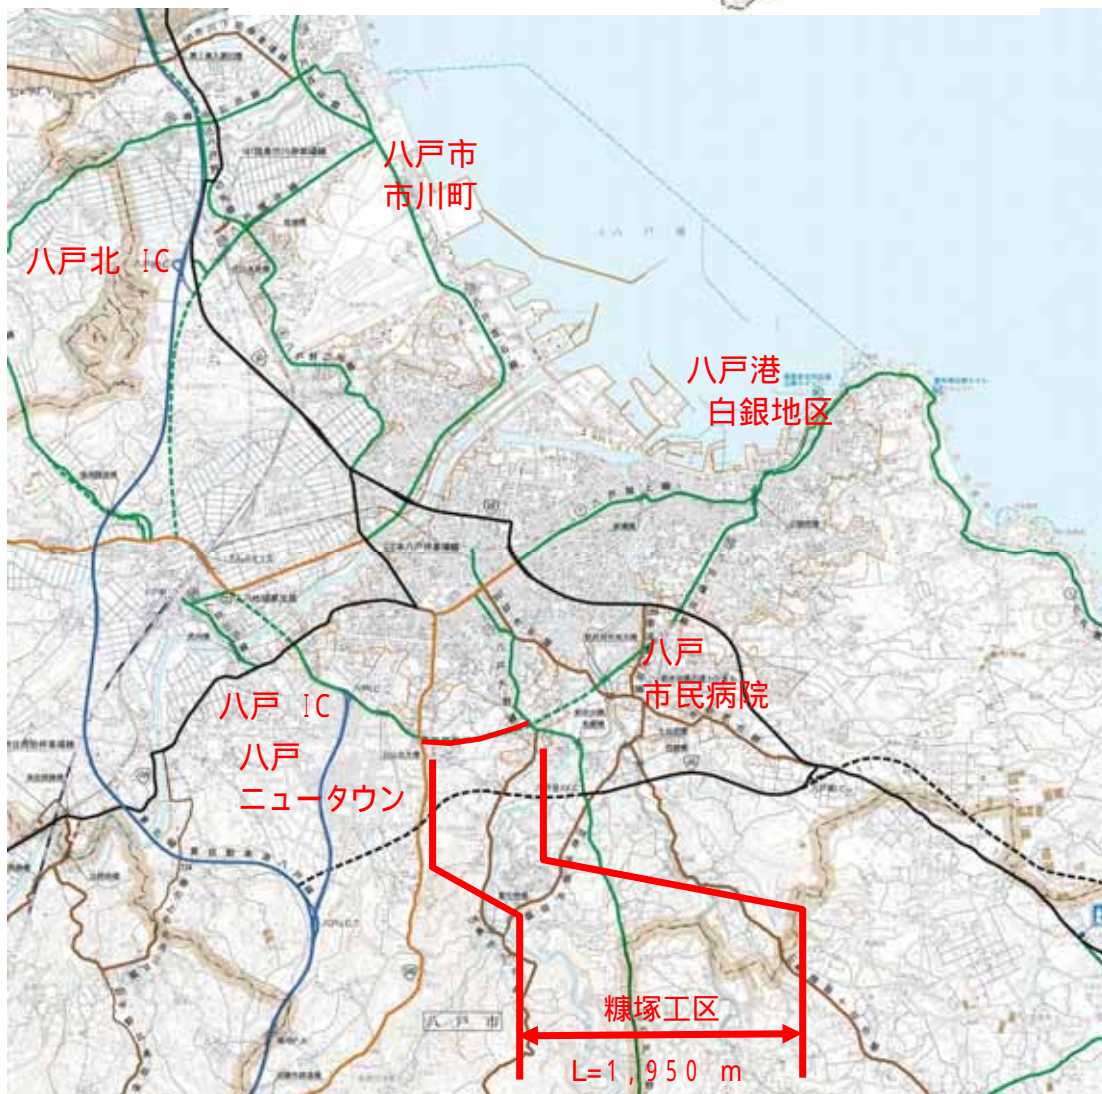


(3) 全体計画平面図

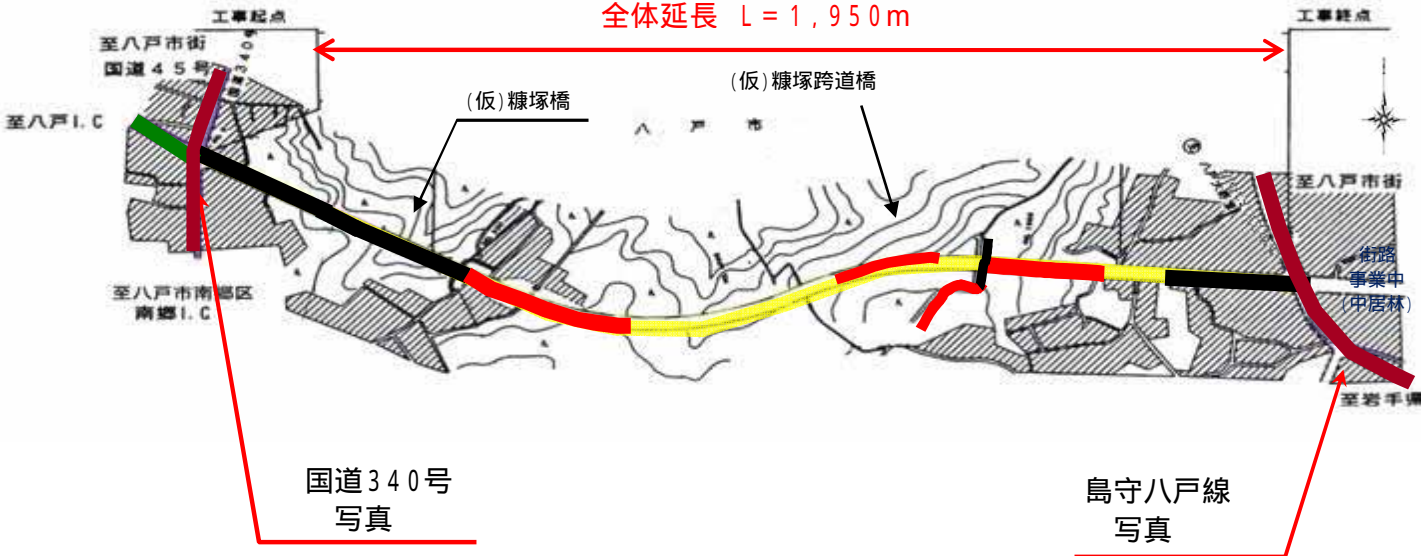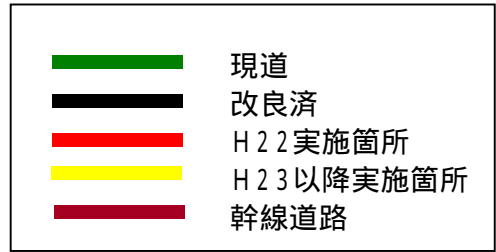

(構造図)

標準横断面図

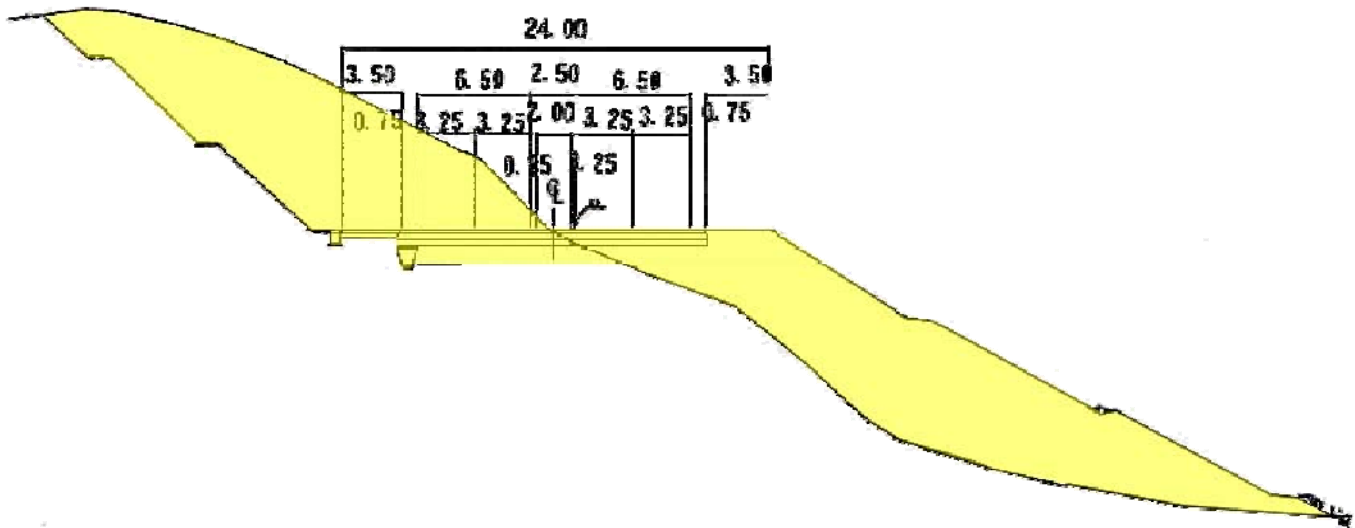

〔現道の交通状況〕



・糠塚跨道橋(市道部)から工事終点部を望む。延伸部は既に供用済みの田向工区及び事業中の中居林工区(街路事業)



・八戸市街地を通過する大型車交通が著しい状況 (国道340号)



・冬期間は、除雪による堆雪で歩行者空間の確保も困難となり、歩行者が危険にさらされている。(島守八戸線)
