

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備部長表彰

工事名	八戸環状線道路改良工事		
受注者名	株式会社田名部組		
工事場所	八戸市大字尻内町地内	請負代金額	¥ 339,515,000（税込）
工期	令和 6年 1月25日～令和 7年 3月 21日	成績評定点	88点
完成年月日	令和 7年 3月 14日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	白戸 拓磨	総括監督員	相馬 基
工事内容	施工延長 L=300.0m 道路改良 1式 法面工 1式	主任監督員	鳩 祐行
		監督員	山本 凌太

推薦理由

本工事は、主要地方道八戸環状線の道路改良事業の一環として天久岱Ⅱ期工区2.5kmのうち、300m区間において 道路改良工事（主要工種「道路土工、法面工、排水構造物工」）を実施したものである。

当該工事は、現道切替及び隣接工事が複数あり工程調整を図る必要があった。このため、現場の見える化、作業効率向上を図るため、4Dステップ・SYMPHONYplusを導入し、月1回ドローン撮影により現場進捗状況をリアルタイムに発注者へ報告及び連絡協議等で使用し施工性向上に努めた。また、現道切替工事を早期に着手するために地権者との完成イメージ共有としてARを活用し工程短縮の向上に取り組んだ。

地域貢献活動において、青森県知事による現場訪問の機会があり、現場従事者手技術者による3次元データ、ドローン、AR等を紹介し、実際に体験していただいた。青森県知事の公式動画チャンネル「A-tube」にも取り上げられ、建設業のイメージアップおよび人材確保への貢献に努めた。以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」、「イメージアップおよび先見性等」に該当することから青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、本現場へ宮下県知事にご来訪賜りましたこと、また青森県県土整備部優良工事表彰県土整備部長表彰という栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。本工事施工において、地域の皆様をはじめ、発注者・プロジェクトパートナー・関係者各位のご指導ご協力を賜りながら、安全管理と品質確保に努め、無事竣工を迎えることができましたことを心より感謝申し上げます。

田名部組は『人と地域社会のために』を企業理念に掲げ、顧客の信頼と満足を得る品質の構築物・サービスを提供できるよう、社員一人一人より一層の技術力向上と品質確保に努めております。

今後もこの受賞を励みに、地域の発展と安全・安心な社会資本整備に貢献できるよう、施工品質の更なる向上と安全管理の徹底を行まいりますのでご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。



代表取締役CEO
田名部 智之



土木部 第二事業部
土木一課 課長補佐
白戸 拓磨

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備部長表彰

工事名	3・3・8白銀市川環状線道路改築工事		
受注者名	穂積建設工業株式会社		
工事場所	八戸市大字尻内町地内	請負代金額	¥ 322,905,000(税込)
工期	令和6年5月3日～令和7年2月16日	成績評定点	88点
完成年月日	令和7年1月27日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	石藤 将健	総括監督員	相馬 基
工事内容	施工延長 L=165.7m 道路改良1式 擁壁工1式 加幅・拓工1式	主任監督員	鳩 祐行
		監督員	沢目 敬史

推薦理由

本工事は、都市計画道路3・3・8白銀市川環状線の一環として八戸市大字尻内町地内において道路改築（函渠工、補強土壁工、道路土工、アスファルト舗装工）を行ったものである。

当該工事では、函渠工施工時に市道尻内河原線を通行止めにする必要があり、地域住民への負担軽減が最大の課題であった。この課題解決のために施工業者からの技術提案として、当初設計の「場所打ち函渠工」を「プレキャスト製品による函渠工構築」へ変更することで、函渠工の施工日数を138日から40日と大幅に短縮することができた。また、当初見込んでいた終日通行止め期間25日間をゼロ日とし、一般車両等が朝夕の通勤時間帯に通行できるなど地域住民への負担を最小限とした。この提案を採用するにあたり3Dプリンタで作成したミニチュア模型を用いた事前検討の取り組み、工程短縮、安全性の確保（事故・災害ゼロ）や周辺環境へ配慮（苦情発生件数ゼロ件）を達成し工事を完成した。

以上、「工事成績評価点が特に優れているもの」、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果を上げたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

着工前



完成



プレキャスト製品による函渠工施工状況





完了



受賞コメント

この度は県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたりご指導頂きました監督職員の皆様と地域住民の皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

本工事は施工中の通行止め期間の短縮が課題であり、受注時の提案と通勤時間帯に配慮した施工方法を採用したことで、通行止め期間をゼロ日とすることができました。

このような周辺環境への配慮やICT活用による生産性向上についての取り組みを高く評価いただいたものと思っております。

この受賞を励みに、弊社のテーマである「皆様に喜んでもらえる、良い仕事を」を目指し、更なる技術向上に取り組んでまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
石亀 晶丈



監理技術者
石藤 将健

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備事務所長表彰

工事名	国道454号交通安全施設整備工事		
受注者名	株式会社村下建設工業		
工事場所	三戸郡新郷村大字戸来地内	請負代金額	90,398,000円
工期	令和6年6月13日～令和7年1月8日	成績評定点	87点
完成年月日	令和6年11月6日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	桜台 清幸	総括監督員	相馬 基
工事内容	施工延長L=356.7m 排水構造物工1式、舗装工1式	主任監督員	葛西 孝人
		監督員	藤森 直人

推薦理由

本工事は、通学路の交通安全対策として道路幅が狭く急カーブが続く見通しが悪い道路の線形改良を含む歩道の整備を行ったものである。

当該工事は、前回工事で上り車線のための半断面施工を行い、下り車線との高低差がある形状で車両通行させている状態からの施工となり、自動車及び歩行者への安全配慮と早期完成が求められる工事であった。施工に際しては、道路土工でのICT施工の活用とともに、敷鉄板を使用した迂回路の造成による起点側・終点側それぞれの同時作業実施により、作業待ちの回避を図ることで、工期を約2ヶ月短縮させて早期の現道開放を図ることができた。また、施工済歩道部との段差解消のための砕石敷設や交通誘導員による歩行者誘導を行ない、事故防止の徹底を図った。地元に対しては、工事内容や規制方法等について、その都度住民への周知を徹底した。その結果、本工事に係る苦情・トラブルも無く無事故で工事を完成させることが出来た。

以上のことを評し、「工事の安全管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたもの」に該当するため、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

平面図

着工前

完成

受賞コメント

この度は青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

受賞にあたりご指導、ご尽力頂きました監督職員の皆様と地域住民の皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

本工事は、自動車及び歩行者への安全配慮と早期完成が求められる工事であり、ICT施工の活用や、監督職員並びに関係機関との協力のもと、工期短縮に努めたことを高く評価していただいたと思っております。

この受賞を励みに、今後も一層取り組んでまいりますので、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
村下 政拓



主任技術者
桜台 清幸

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備事務所長表彰

工事名	馬淵川広域河川改修（関根川原地区）工事		
受注者名	株式会社山田組		
工事場所	三戸郡三戸町大字川守田地内	請負代金額	118,272,000円
工期	令和5年9月29日～令和6年6月30日	成績評定点	85点
完成年月日	令和6年6月28日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	木村 隆志	総括監督員	三橋 八州男
工事内容	施工延長 L=122.5m 法覆護岸工 N=1式	主任監督員	藤森 由美子
		監督員	戸来 啓

推薦理由

本工事は、三戸郡三戸町大字川守田地内において、馬淵川水系熊原川の洪水被害を防ぐ河川改修の一環として、大型コンクリートブロック積護岸とパラペット形式の特殊堤を施工した工事である。

本工事の施工箇所は、背後に幅員の狭い町道と民家が密接しているうえ、電柱や架空線も存在するという、極めて厳しい現場条件下での工事であり、さらに、工事期間中も一般車両の通行を確保しつつ、地域住民への騒音・振動への配慮や通行者の安全確保が求められるなど、高度な施工への対応が必要とされた。

これら制約の中、高度な技術力と綿密な計画により、安全管理、工程管理、施工管理のすべてに万全を期し、関係機関との調整や地域住民との丁寧なコミュニケーションを通じて、事故や苦情を一切発生させることなく、工事を円滑かつ確実に完成させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、県土整備事務所長表彰という栄えあるご評価を賜り、誠にありがとうございます。公共事業に携わる者として、このような名誉ある賞を頂戴する事は大きな喜びであり、今後の業務に向けた大きな励みとなります。今後とも、技術の研鑽と安全衛生活動により一層努め、地域の発展と住民の皆様の安心につながる施工を目指してまいります。本工事の遂行にあたり、日々ご指導くださいました監督職員の皆様、またご理解とご協力をいただいた近隣住民、関係者の皆様に、心より厚く御礼申し上げます。



代表取締役
山田 幸一



監理技術者
木村 隆志

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備事務所長表彰


工事名	八戸港改修（施改補助）河原木2号栈橋補修工事		
受注者名	北日本海事興業株式会社		
工事場所	青森県八戸市豊洲地内	請負代金額	82,170,000円
工期	令和6年3月20日～令和7年2月28日	成績評定点	85点
完成年月日	令和7年2月21日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	阿部 真二	総括監督員	鹿内 修
工事内容	鋼板補修工1式、防食工1式、 連絡橋・渡橋補修工1式	主任監督員	寺下 純
		監督員	佐藤 隆昭

推薦理由

本工事は、河原木2号栈橋のコンクリート補修、鋼管杭の防食、連絡橋・渡橋の撤去・設置を行う工事である。工事にあって、サケの遡上期間中の海上・水中作業の工事の制限や、栈橋利用船との作業工程の調整が必要であったため、工事日程の制約が著しく厳しい現場であった。しかし、関係機関との調整を密に行い、夜間作業等も実施して作業時間を確保し、工期内に工事を完了させた。また、石油基地内での作業となるため、火器災害防止対策や海上衝突災害防止対策を定め、社内チェックも効果的に機能しており、安全面も優れていた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

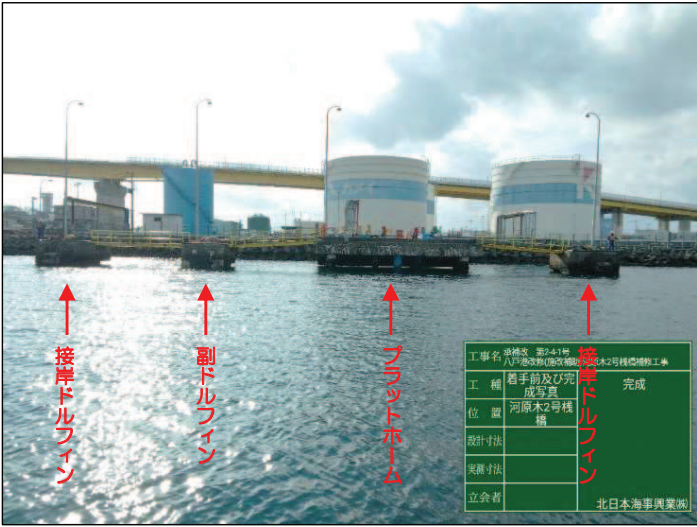

【完成】



潜水士による足場組立



夜間（干潮）作業



栈橋利用に伴う工事制限



栈橋関係者との調整会議

受賞コメント

この度は栄誉ある三八県土整備事務所表彰を賜り誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様、ならびに関係業者の皆様に心より御礼申し上げます。

本工事は港湾工事特有の制約があり、また栈橋機能を制限せず工事を進める事が求められ、当初より工程管理が大きな課題でありました。工事を進めるにあたり、監督職員の皆様の迅速な協議と対応、変則的な工程に対する協力業者の作業、また都度の連絡調整にご対応いただきました栈橋利用関係者の皆様におかれ、多大なご協力のもと無事完成に至ったものであり、重ねて御礼申し上げます。

今後も地域に根差した企業として、更なる地域の発展に貢献し、この受賞の意味を理解し、社員一同精進してまいります。



代表取締役
梶原 大輔



監理技術者
阿部 真二

令和7年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	桮海岸沖合施設設計業務委託		
受注者名	エイコウコンサルタンツ株式会社		
業務箇所	三戸郡階上町大字道仏地先	委託料	8,965,000円
履行期間	令和6年7月11日～令和7年3月21日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年3月12日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
管理技術者	島守 栄治	総括調査員	三橋 八州男
業務概要	基本設計(消波施設) N=1式	主任調査員	藤森 由美子
		調査員	八戸 彰太郎

推薦理由

本業務は、三戸郡階上町大字道仏地先の桮海岸沖合施設(人工リーフ)の機能復旧のための基本設計を行ったものである。
人工リーフの背後には岩山部を挟んで魚類種苗生産施設があり、この施設では越波並びに岩山を飛び越える捨石・ブロック片による建物被害がたびたび発生している。岩礁帯の複雑な地形を把握し、越波再現計算の精度を高めるため、三次元測量の実施が提案された。この結果から岩山前面の急峻な海底勾配と既設人工リーフ形状が衝撃砕波圧（波が急激に砕波し、通常波力の数倍の波力が働く現象）を引き起こしている可能性が高いことが証明され、人工リーフ再復旧の代替案として、経済的で越波抑制効果が高い対策である「岩山部への局部的な消波工設置」が技術提案された。
また、関係者との協議・打合せにおいても、三次元測量で得られたデータをもとに作成した3Dモデルや動画等を活用した分かりやすい資料により説明することができた。
以上、「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等

受賞コメント

この度は、三八県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員の皆様並びに関係職員の皆様に深く感謝申し上げます。
本業務は、桮海岸の越波や消波ブロック片等の飛散による建物被害の再発防止を目的に、海岸沖合施設の復旧設計を行ったものです。設計は、越波再現解析の精度を高めるために三次元測量を実施し、越波抑制効果の改善と経済性を両立した消波施設の改修案を提案しました。また、計画段階で3D画像による説明資料を作成し、関係者協議の円滑化に努めました。
今回の受賞を励みとし、更なる技術の研鑽に努め、地域社会の発展と住み良い街づくりに貢献できるよう尽力して参ります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
山内 一晃



管理技術者
島守 栄治

令和7年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰


業務名	八戸港維持八太郎大橋外橋梁一般定期点検業務委託		
受注者名	エイト技術株式会社		
業務箇所	青森県八戸市大字河原木地内	委託料	24,222,000円
履行期間	令和6年9月26日～令和7年3月25日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年3月18日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
管理技術者	大嶋 啓介	総括調査員	鹿内 修
業務概要	橋梁定期点検 N = 2 橋 (八太郎大橋、蓮沼陸橋)	主任調査員	寺下 純
		調査員	佐藤 隆昭

推薦理由

本業務は、八太郎大橋及び蓮沼陸橋の橋梁定期点検である。八太郎大橋は橋長L = 421.4m、蓮沼陸橋はL = 370.4mの長大橋で、交通量が非常に多い片側2車線の道路となっており、道路上での作業に危険が伴う業務であった。点検にあたって、近接する鉄道への影響や、道路交通への影響を最小限に抑えるため、作業計画は十分に検討されて実施されており、苦情や事故もなく業務を遂行させた。また、第三者被害の可能性を懸念し、コンクリートの浮きや剥離の可能性がある個所をハンマーで叩き落とすなどして予防措置を行い、実施体制及び執行計画において特に評価が高いものであった。

このことから、「委託業務成績評定点が特に優れているもの」に該当するため、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等

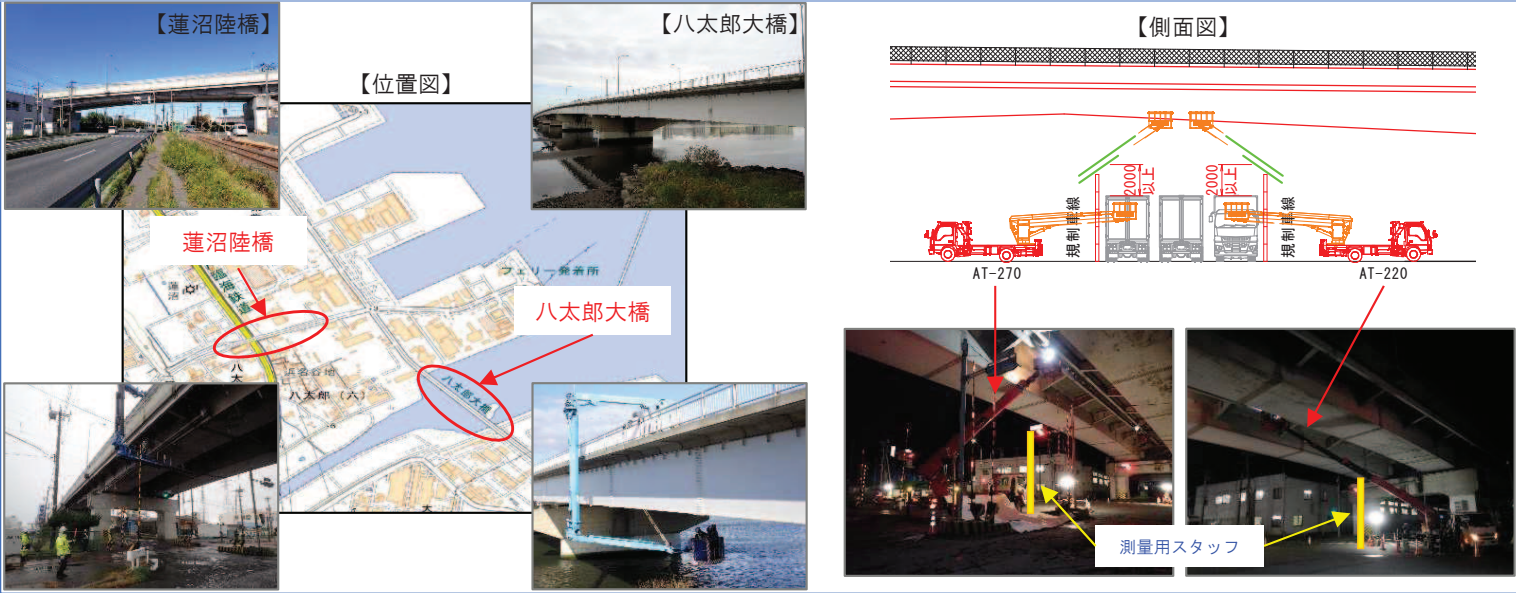

受賞コメント

このたびは、三八県土整備事務所長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職員の皆様に厚く感謝申し上げます。

本業務は、「橋梁」の定期点検を担うものであり、特に交通量の多い箇所においては、安全性を確保しつつ、工期短縮や作業効率の向上を図るため、作業方法や時間帯の工夫に努めました。

今回の受賞を励みとし、新たな時代のニーズに応えるとともに、技術の研鑽を積み重ね、地域社会に貢献できるよう尽力していく所存です。今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
佐藤 富一



管理技術者
大嶋 啓介

令和7年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	橋向五戸線橋梁架替（轟木橋）予備設計業務委託		
受注者名	パシフィックコンサルタンツ 株式会社		
業務箇所	八戸市大字市川町 地内	委託料	12,716,000円
履行期間	令和6年4月25日～令和7年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和7年3月19日	推薦公所	青森県三八県土整備事務所
管理技術者	石井 一人	総括調査員	相馬 基
業務概要	道路予備設計1式 橋梁予備設計1式	主任調査員	葛西 孝人
		調査員	藤森 直人

推薦理由

本業務は、二級河川五戸川に架かる主要地方道橋向五戸線「轟木橋」の架替事業に伴い、橋梁及び道路の予備設計を実施したものである。河川左岸側の民地及び公共施設や河川との交差角を考慮した架替ルートの比較検討を実施し、決定した道路平面及び縦断線形に対して、厳しい交差条件を満足するねじり剛性や必要な主桁高を確保した変断面の主桁構造となる上部構造形式を提案した。なお、橋梁予備設計は河川橋に想定されるリスクや維持管理等を踏まえ、本橋の強化すべき機能の明確化を図り、橋梁の設計基本コンセプトを立案し、橋梁計画を進めた。また、BIM/CIMを活用した架橋ルートの比較及び構造景観の確認を実施した。

以上、「特筆すべき技術提案があったもの」及び「難易度が高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。


写真・図面等




轟木橋 正面全景



轟木橋 側面全景

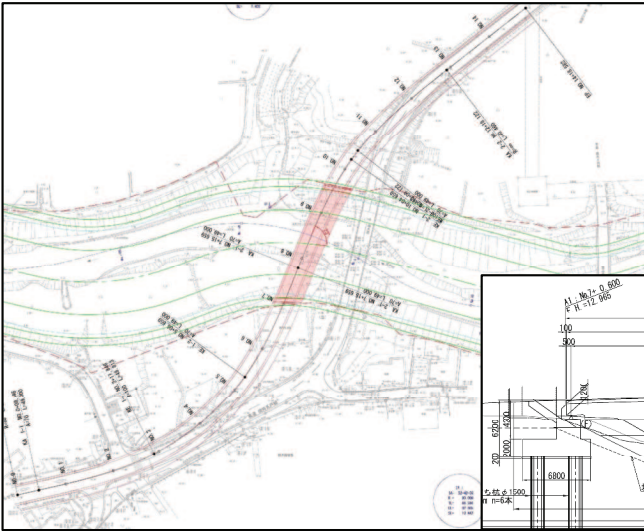

計画平面図

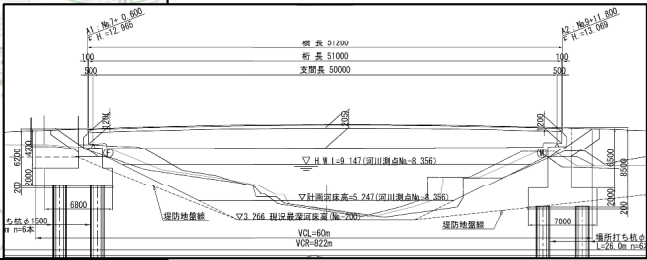

橋梁一般図

受賞コメント

この度は、三八県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

本業務は河川橋における道路及び橋梁の予備設計業務であり、架橋位置の状況から対象橋梁に想定されるリスク等を考慮し、道路や橋梁に対して強化すべき機能の明確化を図り、設計の基本コンセプトを立案及びこれに基づく道路及び橋梁の予備設計を実施し、その結果をBIM/CIMの活用により視覚的な確認も合わせて行いました。

今回の受賞を励みとし、これからも一層の研鑽を重ね、青森県の社会資本整備へ貢献できるよう精進して参ります。今後ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



東北支社長
伊藤 弘明



管理技術者
石井 一人
